

## HASIL MONITORING TRIWULAN IV

### *Kecamatan Bintan Utara*



1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Baru - Tanjung Permai Kec. Bintan Utara (2 Km) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,00. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka penataan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sehingga terwujudnya sarana dan prasarana transportasi/ jalan yang baik untuk mempermudah dan memperlancar akses antar Kampung/Desa. Disamping itu juga sebagai upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan pengamanan badan jalan dari tergerusnya tanah oleh air. Saat dilaksanakan monitoring, kegiatan pembangunan sedang berlangsung. Informasi yang diperoleh dari PPTK untuk lokasi pembangunan jalan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga kegiatan dapat diselesaikan. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah membangun batu miring dan pekerjaan buras beton pada sisi jalan. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan .



2. Pembangunan Paving Blok Jalan Tandean Gg. Suyarto RT. 04 RW. 01 Kec. Bintan Utara (342 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.110.000.000,00. Penggunaan paving block jalan kampung/desa merupakan solusi yang tepat. Penggunaan paving blok ini juga umumnya digunakan untuk halaman sekolah, tempat terbuka lainnya yang membutuhkan pengerasan, ini dikarenakan dengan menggunakan paving block 60% air hujan akan terserap melalui tali air. Dari sisi pembiayaan lebih efisien dan murah dibandingkan dengan menggunakan aspal atau cor beton. Pekerjaan baru dilaksanakan dikarenakan adanya pergeseran lokasi pekerjaan dari Gg. Suyarto RT. 04 RW. 01 ke Gg. Yono RT.02/RW.06 dan Gg. Jambu di Kecamatan Bintan Utara. Pergeseran lokasi ini menurut PPTK adalah tanah di Gg. Suyarto masih masuk dalam wilayah kepemilikan TNI-AL sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pergeseran kegiatan ini sudah diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2016. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan baru mulai dilaksanakan dengan menggelar pasir untuk alas paving blok. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi banjir

sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan. Kemudian pada lokasi pekerjaan belum terpasang papan nama kegiatan padahal pekerjaan sudah dimulai.



3. Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Martosari Gg. Delima RT.11/RW.02 Kecamatan Bintan Utara (258 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp135.000.000.00. Pembangunan jalan dengan menggunakan konstruksi semenisasi beton bertulang dirasakan sangat sesuai untuk jalan lingkungan kampung. Konstruksi ini lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan aspal. Saat dilakukan monitoring oleh Tim, pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan, dan jalan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat.





4. Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Kp. Bugis Kecamatan Bintan Utara (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 475.000.000.00. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara. Disamping itu juga meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan dalam proses pelaksanaan. Pekerjaan yang sedang dilakukan adalah pemasangan talud saluran air yang digunakan sebagai sumber mata air. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi banjir sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan khususnya pembuatan Talud tersebut. Papan informasi kegiatan juga belum terlihat dilokasi untuk itu disarankan kepada pelaksana pekerjaan segera memasang papan tersebut sehingga masyarakat dapat melihat serta ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang berlangsung.



5. Pembangunan Drainase (200 M') dan Gorong-Gorong (1 Buah) Jalan Hang Tuah RT. 01 RW. 07 Kecamatan Bintan Utara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.140.000.000.00. Kegiatan pembangunan drainase sudah cukup mendesak dengan memperhatikan saluran yang sudah rusak dan menyempit. Apabila terjadi hujan dalam kuantitas besar saluran yang ada tidak akan mampu menampung air dan berpotensi banjir. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dan pekerjaan dilaksanakan dengan baik.

6. Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah 2 Lokasi (SMUN 05 Bintan Jl. Sakera Kecamatan Bintan Utara dan SDN 003 Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.160.000.000,00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal waktu yang



telah ditentukan dan pekerjaan dilaksanakan dengan baik. ZOSS tersebut digunakan untuk penyebrangan dan jalan telah dapat dilalui kendaraan.



7. Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 4 Lokasi (Depan SMPN 12 Kecamatan Bintan Utara) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000.00. Warning Light adalah lampu yang dipasang pada suatu lokasi tertentu untuk mengingatkan pengemudi berhati-hati. Biasanya dekat sekolah, pasar dan tempat-tempat strategis. Warning lights yang dipasang menggunakan teknologi solar cell atau panel surya sehingga ramah lingkungan dan hemat energi. Pada saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan Warning Light telah berfungsi dengan baik.





8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Ponton Bulang Linggi Kecamatan Bintan Utara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp.92.000.000.00. Jembatan Ponton Bulang Linggi merupakan fasilitas penambat fery yang menghubungkan Tanjung Uban – Batam sekitarnya. Ponton ini juga digunakan sebagai tempat turun naik penumpang fery. Menurut hasil monitoring kondisi jembatan masih cukup baik namun membutuhkan rehabilitasi sedang khususnya cat dan pemasangan anti karat. Saat dilakukan peninjauan dilapangan pekerjaan rehabilitasi sedang berlangsung. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan sehingga berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan. Papan informasi kegiatan juga belum terlihat dilokasi untuk itu disarankan kepada pelaksana pekerjaan segera memasang papan tersebut sehingga masyarakat dapat melihat serta ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang berlangsung.



9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 001 Bintang Utara (3 Ruang) Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintang Utara. Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan pagu anggaran DAK sebesar Rp.135.000.000.00. Menurut hasil monitoring dilapangan kondisi ruang kelas sudah cukup tua dan memerlukan rehab segera. Saat dilakukan monitoring oleh Tim, pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan, dan bangunan ruang kelas tersebut sudah digunakan untuk proses belajar mengajar.

10. Pemeliharaan Taman Kota Sakera Kecamatan Bintang Utara dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000.00. Pekerjaan yang akan dilakukan adalah pengecatan kanstin, perbaikan pintu musholla dan perbaikan penahan ombak. Sedangkan kanstin telah di selesai cat. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal






yang telah ditentukan. Dan fasilitas umum Taman Kota Sakera Kecamatan Bintan Utara telah dapat digunakan oleh masyarakat umum yang berwisata disekitarnya.



11. Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Durian RT. 01/RW. 02 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara (267 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.140.000.000.00. Pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jalan tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat.

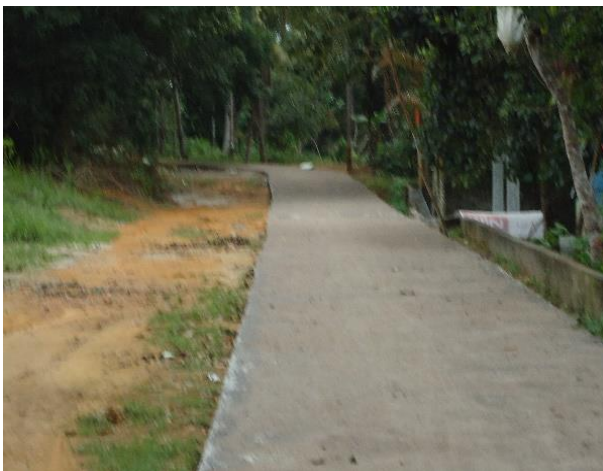



12. Pembangunan Paving Blok Gg. Wahid Dalam Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara (435 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.140.000.000,00. Penggunaan paving block untuk jalan merupakan salah satu solusi yang tepat. Dikarenakan dengan menggunakan paving block 60% air hujan akan terserap melalui tali air. Disamping itu dengan menggunakan type paving block yang bervariasi dan perpaduan warna yang sesuai serta desain yang tepat, sesuai dengan lingkungan sekitar, akan menambah nilai lebih dan keindahan dari estetika dan fleksibilitas area yang di paving block. Dari sisi pembiayaan lebih Efisien dan murah dibandingkan dengan menggunakan aspal atau cor beton. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jalan tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat umum.



13. Pembangunan Box Culvert Samping Kantor Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara (8 M x 3 M x 3 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.462.400.000,00. Box culvert atau disebut juga Gorong-gorong beton adalah gorong-gorong cor di pabrik (precast) ataupun dicor ditempat, dimensi tergantung kepada debit air yang akan dialirkan melalui gorong-gorong. Fungsinya adalah untuk membawa aliran air. Gorong-gorong juga digunakan sebagai jembatan ukuran kecil, digunakan untuk mengalirkan kecil atau sebagai bagian drainase ataupun selokan jalan. Saat dilakukan monitoring pekerjaan sedang dikerjakan pengerukan tanah oleh alat berat, pengecoran box culvert dan gorong-gorong. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya memperlambat penyelesaian pekerjaan.



14. Rehabilitasi Pelantar Beton Bertulang Kp.Mentigi Kel. Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara (45 M x 1,5 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.144.000.000,00. Menurut hasil pemantauan dilapangan pembangunan pelantar beton sangat diperlukan karena saat ini pelantar yang digunakan masyarakat hanya terbuat dari kayu dan kondisinya sudah usang dan lapuk. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan Pelantar tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat.



15. Pembangunan Pelantar Beton Nelayan Hulu Riau RT. 04/RW. 02 Kel. Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara (170 M x 1,5 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.560.000.000.00. Pelantar yang ada sebelumnya adalah pelantar yang masih menggunakan kayu. Pembangunan pelantar dengan menggunakan material kayu sudah tidak cocok untuk daerah pesisir. Selain karena umurnya relatif



singkat, bahan kayu yang kuat untuk jembatan penyeberangan/pelantar juga sulit didapatkan. Sedangkan dengan penggunaan beton, konstruksinya lebih kuat, usianya bisa mencapai puluhan tahun. Apalagi konstruksi dilakukan perawatan secara berkala dipastikan akan awet. Namun dalam pembangunan tiang pancang beton juga perlu memperhatikan kondisi tanah yang berlumpur, agar tiang pancang plantar yang dibangun tidak sampai turun. Saat dilakukan monitoring pekerjaan sedang dikerjakan pengecoran plantar dan pekerjaan pembesian. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya memperlambat penyelesaian pekerjaan.



16. Pembangunan Drainase (225 M') Kp. Mentigi RW. 01 Kel. Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.136,500.000,00. Menurut hasil pemantauan awal dilapangan pembangunan drainase sudah cukup mendesak dengan



memperhatikan saluran yang ada sudah rusak dan menyempit. Apabila terjadi hujan dalam kwantitas besar saluran yang ada tidak akan mampu menampung air dan berpotensi banjir. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hasil dari pelaksanaan pembangunan cukup baik dan rapi. Jalan tersebut sudah dapat dilalui oleh masyarakat.



17. Pemasangan Paving Blok SDN 006 Jl. Imam Bonjol Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintang Timur dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp.68.000.000,00. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Halaman sekolah juga sudah dapat digunakan oleh warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan.





18. Pembangunan Paving Blok, Penimbunan Tanah dan Gorong-gorong Gg. Yayasan Ar Rahman Taman Sari Kel. Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.155,300.000,00. Saat dilakukan monitoring pekerjaan sedang dilaksanakan yaitu pekerjaan penimbunan tanah pada badan jalan yang akan dipasang paving blok. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan memperlambat penyelesaian pekerjaan.

19. Pembangunan semenisasi Jalan Masuk dan Paving Blok Halaman Upacara SDN 003 Kel. Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara (343 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.179,900.000,00. pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Halaman sekolah juga sudah dapat



digunakan oleh warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan.



20. Normalisasi (600 M'), Perkuatan Talud (494 M') dan Duiker (4 M x 2,5 M x 1,5 M) Belakang Masjid Al Mustaqin - SD. 008 RT. 01 RW.01 Kp. Bugis Kel. Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.335.000.000.00. Penguatan talud (dinding saluran) yang terpasang, pembuatan duiker sedangkan pekerjaan normalisasi (pembersihan saluran) dari tanaman-tanaman yang sudah menutupi saluran. Saat dilakukan monitoring, pemasangan dinding saluran sedang dikerjakan, pekerjaan normalisasi saluran telah dilakukan terlebih dahulu sehingga pekerjaan pemasangan talud dapat dilaksanakan. Dari gambar dibawah dapat dilihat pekerjaan yang telah dilaksanakan dan saluran tampak



bersih dan rapi. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan memperlambat penyelesaian pekerjaan.



21. Rehab Kantor dan Partisi Majelis Guru SMP 13 Bintang Jl. Taman Sari No. 14 Kelurahan Uban Utara Kecamatan Bintang Utara dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp.550.000.000,00. Kegiatan pembangunan sedang dalam proses pelaksanaan. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pemasangan atap dan menaikkan bata dinding. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan memperlambat penyelesaian pekerjaan.





22. Pembangunan RKB TK. Arlica Jl. Manggar No. 17 Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp.168,224,500.00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal yang ditentukan dan RKB sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar oleh masyarakat.



23. Pengadaan Tempat Parkir (Kantor Lurah Tanjung Uban Utara) Jl. Manggar No. 1 RT 001/RW 001 Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.000.000,00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal yang ditentukan dan Tempat Parkir sudah dapat digunakan.



24. Pembangunan Drainase/Parit RT. 08 RW. 02 (Perum Bumi Sijori Indah) Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (430 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.157.000.000,00. Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan





25. Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Indun Suri Kp. Lembah Sari RT. 012 RW. 02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (601 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.315.000.000,00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan pembangunan cukup baik dan rapi dan jalan tersebut sudah dapat dilalui oleh masyarakat.



26. Pembangunan Paving Blok Gg. Bambu Jalan Datuk Syahbandar Kp. Kamboja Dalam RT. 01 RW. 01 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (537 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.173.000.000,00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan pembangunan cukup baik dan rapi. Jalan tersebut sudah dapat dilalui oleh masyarakat.





27. Pembangunan Paving Blok Gg. Cempaka Putih Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (483 M<sup>2</sup>) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.155,600.000,00. kegiatan pembangunan dalam tahap penimbunan tanah pada badan jalan yang akan dipasang paving blok. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan memperlambat penyelesaian pekerjaan.



28. Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Perum Griya Bima Kencana RT. 06 RW. 02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (2.277 M<sup>2</sup>) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu



anggaran sebesar Rp.980.000.000,00. Beton bertulang adalah komponen buatan dari gabungan material alam yang diaduk dengan komposisi tertentu untuk mendapatkan kekuatan tekan yang diinginkan. Material alam sebagai campuran dari beton adalah pasir, koral atau split, semen, dan air. Agar diperoleh kekuatan tertentu atau kecepatan dalam pengeringannya, biasanya beton dicampur dengan zat adiktif atau bahan kimia pembantu (chemical admixture). Untuk pekerjaan jenis beton tertentu, juga digunakan jenis semen tertentu. Sementara untuk pekerjaan biasa, semen yang digunakan adalah jenis semen portland (PC). Ini disebabkan ada jenis semen yang tahan terhadap garam, alkali, atau panas yang tinggi. Konstruksi Semenisasi Beton Bertulang sangat sesuai untuk karakteristik lapisan tanah yang cenderung landai dan gampang tergerus air. Sehingga mengakibatkan penggunaan lapisan aspal tidak sesuai. Konstruksi ini sesuai untuk Jalan Perum Griya Bima Kencana RT. 06 RW. 02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintang Utara. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan masih dalam tahap penyelesaian. Sebagian pekerjaan semenisasi sudah dilakukan. Namun sebagiannya lagi masih dalam tahap penyelesaian, Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir

ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan memperlambat penyelesaian pekerjaan.



29. Pembangunan Paving Blok Halaman Sekolah SMPN 12 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (458 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.147,500.000,00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan paving blok telah selesai dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan pekerjaan cukup baik dan rapi. Halaman sekolah tersebut sudah dapat dilalui digunakan untuk aktifitas warga sekolah.







30. Rehabilitasi RKB SMP Negeri 13 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.384.000.000,00. Menurut hasil pemantauan awal RKB SMP Negeri 13 ini perlu segera direhabilitasi mengingat kondisi bangunan yang sudah tidak layak lagi untuk proses belajar mengajar. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan. Pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan dilaksanakan dengan baik. dan RKB tersebut sudah dapat digunakan untuk proses belajar mengajar.



31. Pembangunan Batu Miring SMPN 12 Bintan Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (230 M x 2 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.667,250.000,00. Pemasangan Batu Miring didalam lokasi SMPN12 Bintan sudah tepat dengan memperhatikan kondisi kontur tanah yang bertingkat-tingkat. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan sedang dilaksanakan yaitu pemasangan konstruksi batu miring. Menurut pelaksana pekerjaan pada bagian konstruksi yang sudah selesai akan diisi pemadatan tanah.



Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya memperlambat penyelesaian pekerjaan pembangunan batu miring karena tanah pada posisi miring cenderung mudah runtuh/longsor. Kemudian pada lokasi pekerjaan belum terpasang papan nama kegiatan padahal pekerjaan sudah dimulai. Untuk itu Tim menginstruksikan kepada pelaksana agar segera memasang papan nama kegiatan.



32. Normalisasi Drainase Lingkungan Pasar Baru Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (104 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.90.000.000,00. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan sedang dalam tahap pelaksanaan. Pekerjaan yang dilakukan adalah perbaikan saluran, sedangkan saluran yang sebelumnya dipenuhi reruntuhan



tanah tampak sudah mulai dibersihkan. Tim menyarankan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi banjir sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan perbaikan dan normalisasi drainase. Kemudian pada lokasi pekerjaan belum terpasang papan nama kegiatan padahal pekerjaan sudah dimulai. Untuk itu Tim menginstruksikan kepada pelaksana agar segera memasang papan nama kegiatan.



33. Pembangunan Drainase (400 M') dan Box Culvert (1 Buah) Jalan Dt. Syahbandar RT. 01 dan RT.02/RW.01 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.400.000.000,00. Pada saat dilakukan monitoring, pekerjaan yang sedang dilakukan adalah penggalian parit/saluran. Pemasangan batu miring (talud)



saluran. Tim menyarankan agar pekerjaan segera diselesaikan mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi banjir sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan pembangunan drainase. Kemudian pada lokasi pekerjaan belum terpasang papan nama kegiatan padahal pekerjaan sudah dimulai. Untuk itu Tim menginstruksikan kepada pelaksana agar segera memasang papan nama kegiatan.



34. Pembangunan Drainase (250 M') dan Normalisasi (100 M') Jl. Permaisuri RT.01/RW.01 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,00. Normalisasi sungai/Daerah Aliran Sungai adalah menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu agar sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Kegiatan normalisasi sungai berupa membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Hal ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik-titik rawan tersembunyi aliran air upaya pemulihan lebar sungai/saluran merupakan bagian penting dari



program normalisasi sungai karena meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan ke laut, pembangunan drainase pada saluran jalan permaisuri juga diperlukan. Pada saat dilakukan monitoring, Pekerjaan yang sedang dilakukan adalah pemasangan batu miring dan penggalian parit/saluran. Sedangkan pekerjaan normalisasi sudah dilakukan lebih dahulu agar mempermudah pelaksanaan kerja pembuatan drainase. Tim menyarankan agar pekerjaan segera diselesaikan mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi banjir sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan pembangunan drainase.



35. Pembangunan Paving Blok Gg. Wonorejo RT. 11 RW. 2 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (618 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.199.000.000,00. Menurut hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim, pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan dan sesuai waktu yang telah dijadwalkan, dan jalan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat.



36. Pembangunan Paving Blok dan Pemasangan Rolling Door SDN 004 Bintan Utara Jl. Taman Sari No. 29 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Timur dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp.268,600.000,00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembuatan rolling door sudah selesai dilaksanakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan. Ruang kelas sudah dapat digunakan. Sementara itu pekerjaan pemasangan paving blok juga sudah selesai dilaksanakan sehingga sudah bisa digunakan oleh siswa.



37. Pembangunan Drainase Gg. Mandiri s/d Gg. Mitra RT 03 RW 01 Kel. Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintang Utara (471 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,00. Menurut hasil monitoring dilapangan pembangunan drainase sudah cukup tepat. Karena belum ada drainase pada bahu jalan. Pada saat dilakukan monitoring, pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagian besar drainase sudah terpasang. Namun masih ada bagian drainase yang masih baru dalam tahap penggalian saluran. Tim menyarankan agar pekerjaan segera diselesaikan mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi banjir sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan.

## *Kecamatan Gunung Kijang*



38. Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 4 Lokasi (SDN 003 Jl. Wisata Bahari Kecamatan Gunung Kijang, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00. Warning Light digunakan untuk memberi tanda perhatian atau peringatan akan bahaya dalam bentuk cahaya lampu yang berputar atau berkedip. Untuk di Kecamatan Gunung Kijang dipasang untuk peringatan pada jembatan penyebrangan sekolah. Saat dilakukan monitoring dilapangan pekerjaan selesai dilaksanakan.







39. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Gunung Kijang (2 Ruang) Jl. Bukit Piatu Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dengan pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 90.000.000,00. Menurut pemantauan Tim Monitoring di lapangan rehabilitasi ruang kelas diperlukan karena kondisi ruang kelas yang sudah cukup tua. Saat dilakukan monitoring, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan ruang kelas tersebut sudah dapat dipergunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar.



40. Pemeliharaan TPU di Kecamatan Gunung Kijang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,00. Pemeliharaan TPU diperlukan mengingat kondisi pagar yang sudah cukup usang khususnya cat pada dinding pagar. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan pemeliharaan telah selesai dilaksanakan. Dan tampak penampilan dari pagar TPU terlihat lebih cerah. Penyelesaian pekerjaan



pemeliharaan TPU sudah cukup baik dan tepat waktu.



41. Belanja pemindahan jaringan komunikasi data Kecamatan Gunung Kijang Rp.150.000.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Jaringan komunikasi data ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu fasilitas penunjang untuk pembuatan e-KTP di Kecamatan. Menurut hasil pemantauan dilapangan saat dilakukan monitoring, pekerjaan pemindahan jaringan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan jaringan komunikasi tersebut telah digunakan untuk pengelolaan data kependudukan.





42. Pembangunan Toilet Umum Pasar Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.380.000.000,00. Fasilitas toilet umum dipasar Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang sudah ada sejak dibangunnya pasar. Namun sejalan dengan pertumbuhan pasar toilet yang ada sudah tidak mampu untuk menampung kapasitas warga yang memanfaatkannya sehingga perlu direhab/diganti. Untuk itu pekerjaan membangun toilet baru pada tempat yang baru diperlukan dilokasi pasar tersebut. Menurut hasil monitoring yang dilakukan pekerjaan sedang dalam tahap penyelesaian. Pekerjaan yang dilakukan adalah finishing bangunan wc/toilet, pemasangan keramik lantai, dan pembuatan septik tank/air kotor. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan. Pada lokasi pembangunan juga tidak terdapat papan nama kegiatan. Tim menyarankan papan nama tersebut segera dipasang untuk memudahkan masyarakat turut mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung.



43. Normalisasi Saluran/Sungai dan Pembangunan Talud RW.05 s/d RT.03 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang (500 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.435.000.000,00. Normalisasi Parit/sungai adalah suatu metode yang digunakan untuk menyediakan alur Parit/sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Tujuan normalisasi sungai/parit disini adalah membersihkan rumput/semak yang memenuhi saluran/parit sehingga menghambat aliran air dan berpotensi menyebabkan banjir. Dari hasil peninjauan lapangan lokasi pekerjaan normalisasi parit sangat perlu penanganan cepat karena parit/sungai nyaris tertutup semak dan kondisi saluran yang sangat dangkal. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan dalam proses penyelesaian pemasangan talud. Sedangkan normalisasi saluran telah dikerjakan terlebih dahulu dan telah selesai dikerjakan dengan baik. Saluran telah berfungsi dengan baik sehingga diharapkan dapat mengatasi potensi banjir dilingkungan sekitar. Terkait dengan pekerjaan pemasangan Talud, Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.



44. Normalisasi Parit RT.03/RW.05 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang (124 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan dalam proses penyelesaian pemasangan batu miring/talud untuk saluran. Sedangkan normalisasi saluran telah dikerjakan terlebih dahulu dan telah selesai dikerjakan dengan baik. Saluran telah berfungsi dengan baik sehingga diharapkan dapat mengatasi potensi banjir dilingkungan sekitar. Terkait dengan pekerjaan pemasangan saluran tersebut, Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.



45. Normalisasi Drainase Jalan Segame RT.02/RW.05 Kel Kawal Kecamatan Gunung Kijang (93 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan sedang proses finishing/penyelesaian dilaksanakan. tampak dalam Gambar Saluran drainase sudah tertata serta bersih dari semak belukar yang sebelumnya menutupi saluran tersebut. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.





46. Pembangunan Paving Blok Halaman SD. 02 Jalan Wisata Bahari KM. 29 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang (124 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.000.000,00. Penggunaan paving block untuk halaman sekolah merupakan solusi yang tepat. Penggunaan paving blok ini juga umumnya digunakan tempat terbuka lainnya yang membutuhkan pengerasan, ini dikarenakan dengan menggunakan paving block 60% air hujan akan terserap melalui tali air. Dari sisi pembiayaan lebih efisien dan murah dibandingkan dengan menggunakan aspal atau cor beton. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dan dikerjakan cukup baik. Halaman SD tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan upacara dan lainnya.



47. Optimalisasi SPAM IKK Kawal - Rumah Bahagia Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.263.000.000,00. Kegiatan ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat untuk mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan khususnya di Panti Wredha Rumah Bahagia. Disamping itu juga meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat



dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dikerjakan tetapi air belum bisa dialirkan. Menurut informasi yang diperoleh dari PPTK pengaliran air masih dilakukan koordinasi dengan SPAM IKK Kawal sebagai pipa utama pendistribusian air bersih khususnya di Kelurahan Kawal. Tim mengharapkan agar pendistribusian air ini segera dilaksanakan mengingat pentingnya kebutuhan air bersih dilokasi Rumah Bahagia.



48. Pengembangan SPAM IKK Kawal Kecamatan Gunung Kijang (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.470.500.000,00. Kegiatan ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat khususnya mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah Kawal Kecamatan Gunung Kijang. Disamping itu juga meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat dilakukan monitoring, kegiatan dalam tahap pemasangan jaringan pipa. Pekerjaan yang dilakukan adalah penanaman pipa utama distribusi air minum dari waduk/penampung sumber air minum. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan. Pada lokasi pembangunan juga tidak terdapat papan nama kegiatan. Tim menyarankan papan nama tersebut segera dipasang untuk memudahkan masyarakat turut mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung.







49. Pembangunan/Peningkatan Jalan Cikolek - Kawal Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Gunung Kijang (4,8 Km ) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.000.000.000,00. Kegiatan pembangunan Ruas jalan Cikolek - Kawal Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan merupakan Ring Road yang ada di Kabupaten Bintan yang dibangun dengan anggaran DAK-IPD. Jalan ini dibangun untuk jalur bagi kendaraan kelas ringan sampai berat (Truck dan Trailer), maupun Bus yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada masa-masa yang akan datang. Seiring perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat, maka Pemerintah melakukan peningkatan pada ruas jalan ini. Peningkatan dilakukan dengan cara pelebaran antara 5,5 s.d 6 meter, lapis tambah (Overlay). Peningkatan dilakukan bukan hanya pada lapisan perkerasan tetapi juga bangunan pelengkap berupa drainase, decker dan lainnya. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan dalam tahap pelaksanaan. Pekerjaan yang sedang dilakukan adalah penggalian serta pembangunan saluran, pekerjaan pengaspalan dan pelebaran jalan dengan pemasangan beton bertulang lapisan. Untuk lokasi pembangunan jalan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan, sehingga kegiatan diharapkan dapat segera diselesaikan. Tim juga menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.



50. Pembangunan Paving Block RT 01/ RW III Kp. Beringin Depan Masjid Al-Furqon Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang (210 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.68.000.000,00. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jalan tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat umum.



51. Pembangunan Paving Blok RT. 002 RW. 004 Jeropet Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang (658 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.212.000.000,00. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jalan tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat umum.



52. Pembangunan Pelantar/Tambatan Perahu RT. 03/RW. 1 Kp. Kawal Pantai Kelurahan Kawal. Kecamatan Gunung Kijang (25 M x 2 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00. Menurut hasil monitoring Tim dilapangan kondisi pelantar yang digunakan saat ini oleh masyarakat sangatlah memprihatinkan. Jembatan/pelantar yang dibangun masyarakat dengan menggunakan papan yang sudah usang dan lapuk. Tentunya ini sangat membahayakan bagi masyarakat pengguna jalan. Terlebih lagi di malam hari. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan jalan tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat umum. Diharapkan dengan terbangunnya pelantar tersebut akan lebih membantu masyarakat dalam beraktifitas.



53. Pembangunan Jembatan Cikolek - Kawal Kecamatan Gunung Kijang (6 M x 9 M ) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran DAK sebesar Rp. 1.170.000.000,00. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, relkereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun di jalan Cikolek - Kawal Kecamatan Gunung Kijang adalah untuk penyeberangan pejalan kaki maupun kendaraan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan jembatan dalam tahap pembangunan konstruksi badan jembatan. Tim juga menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi banjir dan tentunya memperlambat penyelesaian pekerjaan.



54. Pemasangan instalasi listrik dan penyambungan daya listrik PKBM masyarakat Kp. Sidoharjo di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00. Menurut hasil monitoring dilapangan bangunan PKBM masyarakat Kp. Sidoharjo di Kelurahan Kawal belum memiliki meteran listrik sendiri. Pekerjaan yang akan dilakukan adalah pemasangan meter listrik dan



instalasi jaringan listrik. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan aliran listrik sudah dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai pengguna gedung.



55. Pembangunan/ Pengaspalan Jalan Kamboja RT. 01/RW. 01 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang (1 Km x 4 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.800.000.000,00. Pengaspalan Jalan Kamboja merupakan tahapan pembangunan serta peningkatan jalan yang ada di Kabupaten Bintan. Dengan dilakukannya pengaspalan maka jumlah jalan dalam kondisi baik akan meningkat. Pengaspalan ini juga dilaksanakan dalam rangka penataan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sehingga terwujudnya sarana dan prasarana transportasi/ jalan yang baik untuk mempermudah dan memperlancar akses antar Kampung/Desa. Disamping itu juga sebagai upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan pengamanan badan jalan dari tergerusnya tanah oleh air. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan baru dimulai. Informasi yang diperoleh dari PPTK progres pekerjaan sedang dalam tahap persiapan alat berat. Untuk lokasi pembangunan jalan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan. Tim menyarankan agar



pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim penghujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan. Pada lokasi pembangunan juga tidak terdapat papan nama kegiatan. Tim menyarankan papan nama tersebut segera dipasang untuk memudahkan masyarakat turut mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung.



56. Pembangunan Pagar SD 003 Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang (126 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00. Pagar tersebut diperlukan sebagai pembatas antara halaman sekolah dengan perumahan masyarakat. Disamping sebagai persyaratan estetika bangunan pagar tersebut juga sebagai prasarana sekolah yang membatasi siswa agar tidak bermain diluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran berlangsung. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dikerjakan dengan baik sesuai waktu yang telah dijadwalkan.



57. Peningkatan Kapasitas SPAM Desa Malang Rapat dan Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.285.000.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat untuk mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan khususnya di Desa Malang Rapat dan sekitarnya. Disamping itu juga meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan sedang dalam tahap pelaksanaan. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan. Pada lokasi pembangunan juga tidak terdapat papan nama kegiatan. Tim menyarankan papan nama tersebut segera dipasang untuk memudahkan masyarakat turut mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung



58. Teralis Polindes Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang (60 M2 x 550.000,00) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00. Teralis Polindes diperlukan karena sebagai prasyarat keamanan Posyandu serta sebagaiantisipasi aksi kriminalitas pencurian atau pembobolan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Saat ini bangunan posyandu belum memiliki teralis sehingga diperlukan teralis pada jendela maupun pintu bangunan. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan





pekerjaan teralis telah diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.



59. Pembangunan Toilet Umum Kawasan Wisata Pantai Trikora Desa Malang rapat Kecamatan Gunung Kijang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 380.000.000,00. Menurut hasil monitoring yang dilakukan pekerjaan sedang dalam tahap penyelesaian. Pekerjaan yang dilakukan adalah finishing bangunan wc/toilet dan pembuatan septik tank/air kotor. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.







60. Pembangunan Paving Blok Jalan Gereja Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang (543 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000,00. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jalan tersebut telah dapat digunakan oleh masyarakat umum.



61. Teralis Polindes Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kecamatan gunung kijang (60 M2 x 550.000,00) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.000.000,00. Teralis Polindes diperlukan karena sebagai prasyarat keamanan Posyandu serta sebagai antisipasi aksi kriminalitas pencurian atau pembobolan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Saat ini bangunan posyandu belum memiliki



teralis sehingga diperlukan teralis pada jendela maupun pintu bangunan. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan pembangunan telah selesai dilaksanakan.



62. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp. Banjar Lama RT. 03/RW. 04 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang (700 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.792.000.000,00. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan masih dalam tahap penyelesaian. Pekerjaan pengaspalan jalan baru sebagian dilakukan tetapi saluran/drainase telah selesai dikerjakan. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.





63. Pemasangan instalasi listrik dan penyambungan daya Sekolah satu atap SDN 005 dan SPMN 27 Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.000.000,00. Pemasangan instalasi listrik diperlukan karena bangunan saat ini belum mempunyai meteran listrik sendiri dan masih menyambung dari bangunan lain. Kondisi seperti ini tentunya akan berpotensi menimbulkan bahaya korleting/ hubungan pendek. Pekerjaan yang akan dilakukan adalah pemasangan meter dan instalasi jaringan. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan.



64. Belanja Perawatan Rambu - Rambu Lalu Lintas / Delineator Korindo (100 buah Rambu dan 100 buah Delineator) Kecamatan Gunung Kijang (Jl. Kantor Lurah Kawal, Arah SMPN 5 - Jl. Baru) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,00. Delineator adalah rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir kiri atau kanan jalan, sebagai peringatan bagi para pengemudi kendaraan bermotor bahwa jalan yang sedang dilalui cukup berbahaya, sangat tepat dipasang pada lokasi jalan menikung dan dilengkapi dengan Reflector Scotchlite dengan posisi yang sangat ideal untuk jangkauan pandang pengemudi pada malam hari yang memantulkan sinar dari jarak jauh



bila tersorot lampu kendaraan. Dari hasil pemantauan dilapangan saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



65. Pengadaan dan Pemasangan Delineator 300 buah Korindo Kecamatan Gunung Kijang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,00. Delineator adalah rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir kiri atau kanan jalan, sebagai peringatan bagi para pengemudi kendaraan bermotor bahwa jalan yang sedang dilalui cukup berbahaya, sangat tepat dipasang pada lokasi jalan menikung dan dilengkapi dengan Reflector Scotchlite dengan posisi yang sangat ideal untuk jangkauan pandang pengemudi pada malam hari yang memantulkan sinar dari jarak jauh bila tersorot lampu kendaraan. Dari hasil pemantauan dilapangan saat dilakukan monitoring, kegiatan



pembangunan telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## *Kecamatan Toapaya*



66. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Sinjang - Jalan Kencana Kp. Sinjang RT. 04 s/d RT. 03 Desa Toapaya Kecamatan Toapaya (panjang jalan 1,5 Km x lebar 4 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.200.000.000,00. Pembangunan ini dilaksanakan dalam rangka penataan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sehingga terwujudnya sarana dan prasarana transportasi/ jalan yang baik untuk mempermudah dan memperlancar akses antar Kampung/Desa. Disamping itu juga sebagai upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan pengamanan badan jalan dari tergerusnya tanah oleh air. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari PPTK untuk lokasi pembangunan jalan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga pekerjaan apat diselesaikan.



67. Pembukaan Akses Jalan Lingkar Angsana menuju Gg. Boyan RT.2/RW.1 Desa Toapaya Kecamatan Toapaya (panjang 400 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.190.000.000,00. Kegiatan pembukaan akses jalan ini adalah untuk meningkatkan sarana jalan yang digunakan sebagai transportasi darat juga untuk meningkatkan jasa pelayanan pada masyarakat pemakai jalan yang terus meningkat. Pembangunan jalan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal memperlancar arus lalu lintas sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat diharapkan akan meningkat, dengan lancarnya arus lalu lintas serta memberi efisiensi waktu. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan Pembukaan Akses Jalan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.



68. Pembangunan Paving Blok Masjid Al-Kautsar Cikolek Kecamatan Toapaya (luas 481 M<sup>2</sup>) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.000.000,00. Penggunaan paving block untuk halaman masjid dilokasi tersebut merupakan solusi yang tepat. Penggunaan paving blok ini juga umumnya digunakan untuk jalanan, halaman sekolah, tempat terbuka lainnya yang membutuhkan pengerasan, ini dikarenakan dengan menggunakan paving block 60% air hujan akan terserap melalui tali air. Sehingga penyerapan air lebih maksimal dan tidak banyak terbuang. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan paving block tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai jadwal dengan hasil yang cukup baik.



69. Pembangunan Pagar SDN 005 Cikolek Kecamatan Toapaya (107 M<sup>2</sup>) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.153.000.000,00. Pembangunan pagar sudah tepat sesuai dengan kebutuhan, memperhatikan pagar yang ada (existing) sudah tidak layak dan bahkan sebagian ada yang roboh. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan pagar tersebut sudah





selesai dikerjakan sesuai jadwal dengan hasil yang cukup baik.




70. Pembangunan Paving Blok Halaman SDN. 006 Lome Kecamatan Toapaya (528 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.173.000.000,00. Penggunaan paving block untuk halaman sekolah tersebut merupakan solusi yang tepat. Penggunaan paving blok ini juga untuk menutup halaman sekolah yang sebagian paving bloknya sudah rusak. Saat dilakukan monitoring pekerjaan pembangunan paving block tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan dikerjakan dengan cukup baik. halaman sekolah sudah dapat dipergunakan oleh kegiatan upacara maupun kegiatan sekolah lainnya.





71. Pembangunan Sarana air bersih dan WC SMA 2 Toapaya Kecamatan Toapaya (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.304.000.000,00. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat terlebih lagi disekolah. Untuk kelancaran serta kenyamanan dalam proses belajar mengajar, dibutuhkan sarana air bersih yang mana selama ini instalasi air bersih di SMA 2 tersebut sudah tidak memadai lagi. Disamping itu pembangunan sarana air bersih dan WC untuk SMA 2 Toapaya perlu memperhatikan lokasi yang tepat agar sarana air bersih yang akan dibangun tidak sampai terkontaminasi limbah dari WC. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan tersebut telah selesai di laksanakan. Dan sarana air bersih tersebut telah dapat digunakan oleh guru dan siswa.

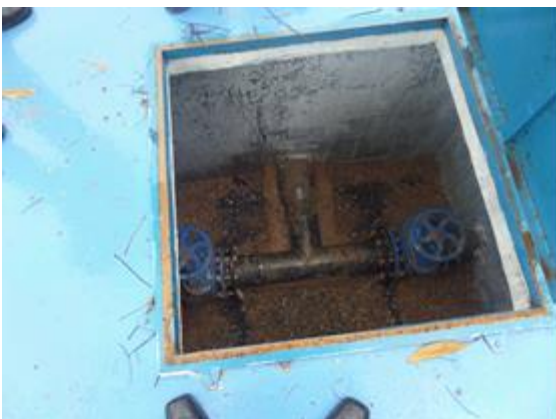

72. Pengembangan SPAM IKK Toapaya Kecamatan Toapaya (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp.585.979.000,00. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam memenuhi pelayanan air bersih bagi masyarakat di Toapaya. Kegiatan pengembangan ini dilaksanakan dengan membangun jaringan pipa air minum di wilayah Kecamatan Toapaya yang menjangkau rumah masyarakat. Menurut hasil penijauan Tim Monitoring dilapangan pekerjaan sudah selesai dikerjakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ketersediaan air melalui fasilitas ini telah dinikmati masyarakat.

73. Rehab Posyandu Jalan Kamboja Cikolek Kecamatan Toapaya (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.120.000.000,00. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Agar pelaksanaan pelayanan kepada pasien lebih optimal sarana bangunan juga harus layak dan memadai. Posyandu



Jalan Kamboja Cikolek Kecamatan Toapaya memerlukan rehabilitasi mengingat bangunan lama sudah kurang layak. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan rehabilitasi posyandu tersebut telah diselesaikan dengan baik sesuai jadwal, namun belum digunakan. Tim menyarankan agar fasilitas umum bidang kesehatan ini segera dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat setempat, sehingga hasil pembangunan berhasil guna dan tepat guna.



74. Teralis Polindes Cikolek Desa Toapaya Kecamatan Toapaya (60 M2 x 550.000,00) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00. Teralis Polindes diperlukan karena sebagai prasyarat keamanan Posyandu serta sebagai antisipasi aksi kriminalitas pencurian atau pembobolan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Saat ini bangunan posyandu belum memiliki teralis sehingga



diperlukan teralis pada jendela maupun pintu bangunan. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan teralis telah diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.



75. Pembangunan Pagar TPU di Cikolek KM. 30 Desa Toapaya Kecamatan Toapaya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dengan pagu anggaran sebesar Rp.186.000.000,00. Pembangunan pagar sudah tepat sesuai dengan kebutuhan, karena saat ini TPU belum memiliki pagar pembatas. Saat dilakukan monitoring pekerjaan pembangunan Pagar TPU di Cikolek KM. 30 Desa Toapaya tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan dikerjakan dengan cukup baik.





76. Pemasangan Instalasi Listrik dan penyambungan Daya Listrik Polindes Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,00. Pemasangan instalasi listrik diperlukan karena bangunan saat ini belum mempunyai meteran listrik sendiri dan masih menyambung dari bangunan lain. Kondisi seperti ini tentunya akan berpotensi menimbulkan bahaya korsleting/ hubungan pendek. Saat dilakukan monitoring pekerjaan pemasangan Instalasi Listrik telah selesai dilakukan dan listrik sudah bisa dinikmati oleh penghuni.

77. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Sumber Karya RT. 15 Kel. Toapaya Asri Kecamatan Toapaya (2 Km) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 7.700.000.000,00.

Pembangunan/Pengaspalan Jalan Sumber Karya sepanjang 2 km diperlukan karena kondisi jalan yang perlu pelebaran untuk mengantisipasi



meningkatnya kendaraan/pengguna jalan. Untuk lokasi pembangunan jalan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga kegiatan dapat segera diselesaikan. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.



78. Pembangunan Paving Blok Halaman SD 01 Kel. Toapaya Asri Kecamatan Toapaya (559 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,00. Saat dilakukan monitoring pekerjaan pembangunan paving block tersebut telah selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan dikerjakan dengan cukup baik. halaman sekolah sudah dapat dipergunakan oleh kegiatan upacara maupun kegiatan sekolah lainnya.





79. Teralis Polindes Toapaya asri Kecamatan Toapaya (60 M2 x 550.000,00) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00. Teralis Polindes diperlukan karena sebagai prasyarat keamanan Posyandu serta sebagai antisipasi aksi kriminalitas pencurian atau pembobolan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Saat ini bangunan posyandu belum memiliki teralis sehingga diperlukan teralis pada jendela maupun pintu bangunan. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan teralis telah diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.

80. Pembangunan Pagar TPU di KM. 23 Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dengan pagu anggaran sebesar Rp.186.000.000,00. Menurut hasil pemantauan dilapangan saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.





81. Pembangunan Pagar TPU di RT. 13 RW. 5 Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya dengan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pagu anggaran sebesar Rp.190.000.000,00. Menurut hasil pemantauan dilapangan saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



82. Normalisasi Parit dan Batu Miring RT. 16 s/d RT. 17 RW. 05 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya (1 Paket) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 167.500.000,00. Normalisasi Parit adalah suatu metode yang digunakan untuk menyediakan alur Parit/sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Tujuan normalisasi sungai/parit disini adalah membersihkan rumput/semak yang memenuhi saluran/parit sehingga menghambat aliran air dan berpotensi menyebabkan banjir. Sedangkan untuk menahan dinding parit agar tidak terjadi tanah longsor dipasang batu miring. Dari hasil peninjauan Tim di lokasi, pekerjaan normalisasi dan pemasangan batu miring tersebut telah selesai dikerjakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan hasil cukup baik.

83. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Jengkol KM. 19 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya (1 Km x 4 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.299.500.000,00. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Jengkol sepanjang 1 km diperlukan karena kondisi jalan yang belum diaspal dan masih dalam kondisi jalan



tanah. Pengaspalan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan serta mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi darat. Untuk lokasi pembangunan jalan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga kegiatan dapat segera diselesaikan. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan telah selesai di laksanakan. Antara lain pengaspalan sebagian ruas jalan, pengerasan dan pembuatan saluran drainase/parit.



84. Pembangunan Drainase Kp. Simpangan RT. 03 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya (414 M') dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.157.000.000,00. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara teknis hampir semua drainase terkait dengan pembuatan saluran. Saluran drainase permukaan biasanya berupa parit, sementara untuk bawah tanah disebut gorong-gorong di bawah tanah. Pada saat dilakukan pemantauan pekerjaan pembuatan drainase telah selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.





85. Pembangunan Paving Blok Jalan Melati Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya (311 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00. Menurut hasil pemantauan dilapangan saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



86. Pembangunan Paving Blok Jalan Mawar RT. 12 RW. 4 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya (404 M2) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.130.000.000,00. Menurut hasil pemantauan dilapangan saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



87. Pembangunan Rabat Beton Kp. Simpangan RT. 02 Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya (621 M<sup>2</sup>) dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00. Rabat beton lantai kerja atau sering disebut lean concrete merupakan lapisan beton bermutu rendah dengan ketebalan umumnya sekitar 5 cm yang biasa terbuat dari campuran beton 1 pc : 3 ps : 5 kr atau bisa juga menggunakan beton readymix B0 atau readymix dan sudah selesai dikerjakan. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan rabat beton tersebut telah diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.



88. Teralis Polindes Gesek Kecamatan Toapaya (60 M<sup>2</sup> x 550.000,00) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.000.000,00. Teralis Polindes diperlukan karena sebagai prasyarat keamanan Posyandu serta sebagai antisipasi aksi kriminalitas pencurian atau pembobolan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Saat ini bangunan posyandu belum memiliki teralis sehingga diperlukan teralis pada jendela maupun pintu bangunan. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pekerjaan teralis telah diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.



89. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Berdikari 1 RT. 01/RW. 01 Cikolek Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya (1 Km x 5 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.726.000.000,00. Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan pembangunan telah selesai.



90. Pembukaan Akses Jalan Mekar Sari Lome Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya (425 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00. Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan pembangunan belum dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari PPTK progres pekerjaan sedang dalam tahap proses lelang. Untuk lokasi pembangunan jalan tidak ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan setelah selesai tahap pelelangan dan penetapan pemenang. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.



91. Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Kangboi Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya (382 M<sup>2</sup>) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00. Semeniasi beton adalah sebutan untuk jalan yang terbuat dari beton bertulang. Jalan ini diklaim memiliki kekuatan yang sangat kokoh, baik untuk menahan gaya beban maupun gaya tarik. Jalan beton dinilai lebih kuat dan lebih awet dibandingkan dengan jalan aspal. Pembangunan Semeniasi Buras Beton Bertulang di Jalan Kangboi ini sudah sesuai dengan kondisi fisik tanah yang mudah longsor. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

92. Pembangunan Pagar TPU di KM.47 Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dengan pagu anggaran sebesar Rp.186.500.000,00. Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.





93. Belanja Pemeliharaan TPU di Kecamatan Toapaya, Teluk Bintang dan Teluk Sebong dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman oleh dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00, Saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.



94. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (15.000M') lokasi 4 kecamatan, (Kecamatan Teluk Seborg, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Toapaya) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 450.000.000,00. Pada saat dilakukan monitoring, kegiatan pemasangan marka jalan telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan hasil yang cukup baik. Jalan pun sudah dapat dilalui masyarakat dan dengan terpasangnya marka jalan diharapkan terus meningkatnya tingkat kepatuhan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya dan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

95. Pekerjaan Paving Blok Jl. Manunggal II Gang Kenanga (Kelurahan Toapaya Asri) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.500.000,00. Hasil pantauan dilapangan pada saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan dan sudah berfungsi dengan baik.



96. Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Lokasi 5 Kecamatan (Kec.Bintan Timur,Kec.Toapaya, Kec Teluk Bintan,Kec Gunung Kijang Kec.Teluk Sebong) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran Rp.130.000.000,00. Delineator adalah rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir kiri atau kanan jalan, sebagai peringatan bagi para pengemudi kendaraan bermotor bahwa jalan yang sedang dilalui cukup berbahaya, sangat tepat dipasang pada lokasi jalan menikung dan dilengkapi dengan Reflector Scotchlite dengan posisi yang sangat ideal untuk jangkauan pandang pengemudi pada malam hari yang memantulkan sinar dari jarak jauh bila tersorot lampu kendaraan. Hasil pantauan dilapangan pada saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan.



97. Pengadaan dan Pemasangan Delineator 300 buah Tirta Madu Kecamatan Toapaya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran Rp.180.000.000,00. Delineator adalah rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir kiri atau kanan jalan, sebagai peringatan bagi para pengemudi kendaraan bermotor bahwa jalan yang sedang dilalui cukup berbahaya, sangat tepat dipasang pada lokasi jalan menikung dan dilengkapi dengan Reflector Scotchlite dengan posisi yang sangat ideal untuk jangkauan pandang pengemudi pada malam hari yang memantulkan sinar dari jarak jauh bila tersorot lampu kendaraan. Hasil pantauan dilapangan pada saat dilakukan monitoring pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan dan sudah berfungsi dengan baik.



98. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Jalan Tirta Madu Kecamatan Toapaya sebanyak 380 buah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan pagu anggaran Rp. 113.940.000,00. Paku Jalan berfungsi sebagai reflektor marka jalan khususnya pada cuaca gelap dan malam hari. Paku yang dipasang adalah pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau



lajur lalu lintas. Saat dilakukan monitoring lapangan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan sudah berfungsi baik.



99. Pengadaan dan pembangunan Pagar Lapangan Bola di Kampung Simpangan Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya sepanjang 93 m, dengan pagu anggaran Rp 135.000.000,00. Saat dilakukan Monitoring kegiatan pembangunan dalam progres tahap persiapan bahan bangunan, pekerjaan penggalian pondasi dan pemasangan besi konstruksi pagar pembatas Lapangan Bola. Tujuan dari pembangunan pagar ini adalah sebagai pembatas agar bila dilakukan aktifitas pertandingan maupun latihan sepak bola tidak mengenai Pemukiman Penduduk. Tim menyarankan agar pekerjaan segera diselesaikan mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini yang sudah memasuki musim penghujan. Tentunya berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan dilapangan. Tim juga menegaskan bahwa papan informasi kegiatan harus segera dipasang agar penduduk juga dapat mengawasi kegiatan tersebut.





100. Pembangunan RKB SDN 004 Toapaya (DAK Lanjutan) dengan pagu anggaran Rp.180.961.280,00 Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dibiayai melalui anggaran DAK. Saat dilakukan monitoring pekerjaan sedang dalam tahap pemasangan/plesteran dinding, pemasangan atap. Tim menyarankan agar pekerjaan segera diselesaikan mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini yang sudah memasuki musim penghujan. Tentunya berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan dilapangan. Tim juga menegaskan bahwa papan informasi kegiatan harus segera dipasang agar penduduk juga dapat mengawasi kegiatan tersebut.

## *Kecamatan Mantang*



101. Pemasangan Instalasi Listrik dan penyambungan Daya Listrik Gedung Induk dan Gedung Rawat Inap Puskesmas Mantang Kec. Mantang. Dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00. Pemasangan instalasi listrik ini diperlukan karena kondisi saat ini Gedung Induk dan Gedung Rawat Inap belum memiliki meter sendiri dan listrik masih disambung langsung dari bangunan lain. Hal ini tentu berpotensi membahayakan bilamana terjadi hubungan pendek. Saat dilakukan monitoring pekerjaan belum dilaksanakan dan menurut PPTK kegiatan Menurut PPTK progres pekerjaan sedang dalam tahap proses administrasi.





102. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya di Kecamatan Mantang (6 Unit) dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00. Kegiatan Pemasangan dan Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut dilaksanakan di RT.06/RW.02 sebanyak 2 (dua) paket; RT01/RW01 Desa Mantang Besar 1 (satu) paket; RT02/RW01 Mantang Baru Pasir Merah 1 (satu) paket; RT03/RW01 Mantang Baru Belakang Sidi 1 (satu) paket; RT06/RW01 Desa Mantang Besar 1 (satu) paket; saat dilakukan peninjauan dilapangan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan lampu jalan tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

103. Pembangunan Sarana Air Bersih Tanjung Elong Desa Mantang Lama Kec.Mantang (2,5 M x 2,5 M, 2 Unit). Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.240.000.000,00. Pembangunan sarana air bersih saat ini diperlukan karena belum tersedianya sarana air bersih seperti SPAM. Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih ini antara lain pengadaan water torrants dan jaringan pipa serta mesin pompa






yang nantinya untuk menyedot air dari sumber air/waduk dan didistribusikan kepada masyarakat. Saat dilakukan monitoring pekerjaan belum dilaksanakan. Dan menurut PPTK kegiatan ini dalam tahap persiapan perencanaan.



104. Pembuatan Batu Miring Desa Mantang Besar Telang Besar RT.05 RW.03 Kec. Mantang (100M'). Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00. Pembangunan Batu Miring dimaksudkan untuk penahan gelombang pasang air laut yang mengakibatkan erosi. Sementara masyarakat banyak yang membangun pemukiman di bibir pantai. Saat dilakukan monitoring pekerjaan belum dilaksanakan, dan menurut PPTK kegiatan ini dalam tahap persiapan perencanaan.



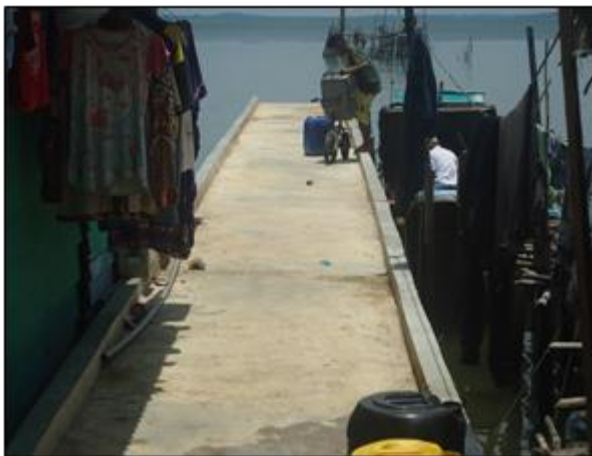

105. Pembangunan Pelantar Masyarakat RT. 02 RW. 01 Pasir Merah Desa Mantang Baru Kec. Mantang (32 M x 1,5 M) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.130.000.000,00. Menurut hasil monitoring dilapangan lokasi pembangunan pelantar masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan. Karena keadaan pelantar yang sekarang ini terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dan tentunya membahayakan masyarakat yang menggunakannya. Padahal pelantar yang ada sering dilalui oleh masyarakat. Pada saat dilakukan pemantauan dilapangan pekerjaan belum dilaksanakan. Menurut PPTK progres kegiatan dalam tahap persiapan pelelangan. Tim menyarankan kepada PPTK agar segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan jadwal pelaksanaannya. Mengingat lokasi pekerjaan yang berada di Pulau, pelaksana diharapkan memperhatikan penyediaan bahan bangunan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

106. Pembangunan Batu Miring Desa Mantang Baru Belakang Sidi Kec.Mantang (100 M'). Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000,00. Pembangunan Batu Miring dimaksudkan untuk menahan gelombang pasang air laut yang mengakibatkan erosi. Sementara masyarakat banyak yang membangun pemukiman di bibir pantai. Saat



dilakukan monitoring pekerjaan belum dilaksanakan, dan menurut PPTK kegiatan ini dalam tahap persiapan perencanaan.



107. Pembangunan Pelantar Desa Dendun Kec. Mantang (45 M x 1,5 M) Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,00. Menurut hasil monitoring dilapangan lokasi pembangunan pelantar masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan. Karena keadaan pelantar yang sekarang ini terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dan tentunya membahayakn masyarakat yang menggunakannya. Padahal pelantar yang ada sering dilalui oleh masyarakat. Pada saat dilakukan pemantauan dilapangan pekerjaan belum dilaksanakan. Menurut PPTK progres kegiatan dalam tahap persiapan pelelangan. Tim menyarankan kepada PPTK agar segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan jadwal pelaksanaannya. Mengingat lokasi pekerjaan yang berada di Pulau, pelaksana diharapkan memperhatikan penyediaan bahan bangunan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.



## *Kecamatan Bintan Pesisir*



108. Pembangunan Septic tank Komunal Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (4 Unit). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.621.595.000,-. Pekerjaan Pembangunan Septic Tank Komunal Desa Mapur sudah selesai dikerjakan. Sejauh ini tidak ada masalah yang berarti. Dari hasil monitoring dapat dilaporkan bahwa kondisi terakhir pembangunan IPAL ini tampaknya akan difungsikan juga sebagai tempat berkumpul masyarakat. Tim monitoring kembali mengingatkan kepada pelaksana pekerjaan agar sambungan saluran pembuangan diperhatikan supaya tidak terjadi kebocoran.





109. Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Mapur Kecamatan Bintan Pesisir (1 Paket). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.475.000.000,-. Pekerjaan Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Mapur sudah selesai dikerjakan, Pekerjaan meliputi pembuatan rumah mesin, pembuatan kolam sumber air, penyambungan pipa ke tower air dan pengadaan mesin. Jarak Sumber air baru ke penampungan diperkirakan  $\pm 1,3$  Km, kolam seluas  $\pm (6 \times 6)$  M<sup>2</sup>. Tidak terdapat kendala dalam pekerjaan dan selesai tepat waktu sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan pada dokumen kontrak.



110. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 06 Gin Kecil Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (2 Lokal, 7 M x 6 M). Indikasi TA.2016 Rp. 327.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 06 Gin Kecil Desa Numbing sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. MANTANG JAYA dengan nilai kontrak Rp.323.350.707,95,-. Dengan konsultan pengawas CV. ARICO GRAHA ABADI CONSULTANT. Menurut



Pelaksana pekerjaan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.



111. Pengembangan SPAM Numbing Kecamatan Bintan Pesisir (1 Paket). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.475.000.000,-. Pekerjaan Pengembangan SPAM Numbing Kecamatan Bintan Pesisir sudah selesai dikerjakan. Sambungan pipa sudah selesai dipasang. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. SASLABA dengan nilai pekerjaan Rp. 463.504.633,45,- . Konsultan Pengawas oleh CV.PISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT.





112. Pembuatan Batu Miring Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (100 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.175.000.000,-. Pekerjaan Pembuatan Batu Miring Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir sudah selesai dikerjakan..



113. Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir (1 Paket). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.712.500.000,-. Pekerjaan Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir sedang dilaksanakan. Pekerjaan ini terdiri dari pembangunan Tower dan kolam di Tanjung Prindid dan penambahan kolam di Tanjung Sengkuang. Untuk Pekerjaan di Tanjung Prindid sudah selesai dikerjakan, Namun mesin dan tanki air belum dipasang. Karena



menunggu selesainya pembuatan kolam di Tanjung Sengkuang. Hal ini juga untuk mencegah kerusakan tanki air dan mesin sebelum hasil pekerjaan dilakukan serah terima kepada Desa Air Glubi. Menurut Dinas Pekerjaan Umum kenapa pekerjaan pembuatan kolam di Tanjung Sengkuang belum dapat dikerjakan dikarenakan lokasi pembuatan kolam di Tanjung Sengkuang terkendala kepemilikan lahan yang diakui kepemilikannya oleh dua warga di Tanjung Sengkuang sehingga surat hibah sampai saat ini belum ada. Menurut Camat Bintan Pesisir hal ini sudah diselesaikan melalui mediasi Kepala Desa Air Glubi. Diharapkan permasalahan lahan ini segera dapat diselesaikan Karena saat ini sudah memasuki bulan kesebelas yang mana sudah mendekati akhir tahun anggaran.



114. Pembangunan Septic tank Komunal Desa Air Glubi Kec. Bintan Pesisir (4 Unit). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.621.595.000,-. Pekerjaan Pembangunan Septic tank Komunal Desa Air Glubi Kec. Bintan Pesisir dikerjakan oleh KSM AIR GLUBI SEHAT dengan nilai kontrak Rp.621.595.000,- dan waktu pelaksanaan 120 Hari Kalender. Saat dilakukan peninjauan lokasi dapat dilaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Ada keluhan dari warga setempat yang yang tempat tinggal nya dekat dengan salah satu





lokasi pembangunan dimana saluran pembuangan yang dibangun menurut mereka tidak sesuai untuk lokasi septic tank rumah darat, sambungan pipa juga ada yang bocor, kebocoran ini juga terdapat pada septic tank yang berada di laut yang beberapa diantaranya jika air pasang mengeluarkan bau tak sedap. Diingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk tetap melakukan pengawasan terkait rencana pembangunan dan kualitas bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor.



115. Teralis Polindes Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir (60 M2 x 550.000,00). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.330.000.000,-. Pekerjaan Teralis Polindes Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir (60 M2 x 550.000,00) sudah selesai dikerjakan. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.





116. Pembangunan Pelantar Beton Gg. Jampong RT. 004 RW. 001 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (72 M x 1,5 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.278.818.000,-. Pekerjaan Pembangunan Pelantar Beton Gg. Jampong RT. 004 RW. 001 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (72 M x 1,5 M) sudah selesai dikerjakan, Pekerjaan dipecah di dua lokasi yg sama pada RT 004 dengan Panjang pada lokasi I sepanjang 56 M, dan lokasi II sepanjang 16 M. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. ENAM PILAR UTAMA dengan nilai kontrak Rp.264.638.319,08,- dan Cv.BINTAN SELIKUR KONSULTAN sebagai Konsultan Pengawasnya.

117. Pembangunan Pelantar Gg. Selikur RT. 03 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (45 M x 1,5 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.180.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Pelantar Gg. Selikur RT. 03 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir panjang (45 M x 1,5 M) sudah selesai dikerjakan, Panjang pelantar yang akan dibangun pada satu lokasi sesuai dengan rencana kegiatan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV.CAHAYA FAJAR dengan nilai kontrak Rp.179.938.939,98,-



dan CV.BINTAN SELIKUR KONSULTAN sebagai Konsultan Pengawas.



118. Pembangunan Pelantar Gg. Jebong RT. 03 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (42 M x 1,5 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.170.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Pelantar Gg. Jebong RT. 03 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (42 M x 1,5 M) sudah selesai dikerjakan, Pekerjaan ini dikerjakan oleh CV.CAHAYA FAJAR dengan nilai kontrak Rp.169.922.769,75,- dan Konsultan Pengawas CV. BINTAN SELIKUR KONSULTAN, waktu pelaksanaan 90 hari kalender.Panjang pelantar yang akan dibangun pada satu lokasi sesuai dengan rencana kegiatan.





119. Pembangunan Pelantar Amzani RT. 04 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (42 M x 1,5 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.170.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Pelantar Amzani RT. 04 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (42 M x 1,5 M) sudah selesai dikerjakan. Untuk penyesuaian panjang pelantar, Pekerjaan tersebut dipecah di dua lokasi yg sama pada RT 004 / RW 1 dengan Panjang pada lokasi I sepanjang 23 M, dan lokasi II sepanjang 19 M. Hendaknya Desa setempat memberikan pengarahannya kepada warga untuk tidak memarkir motornya di pelantar Karena akan menghalangi akses jalan.

120. Pembangunan Pelantar Gg. Zainuddin RT. 06 RW. 02 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (35 M x 1,5 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.140.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Pelantar Gg. Zainuddin RT. 06 RW. 02 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (35 M x 1,5 M) sudah selesai dikerjakan, Untuk penyesuaian panjang pelantar, Pekerjaan tersebut dipecah di tiga lokasi yg sama pada RT 06 / RW 02 dengan Panjang pada lokasi I



sepanjang 15 M, lokasi II sepanjang 12 M, lokasi III sepanjang 8 M . Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV.ALIA BERKAH MANDIRI dengan nilai kontrak Rp.139.837.929,41 dan CV.BINTAN SELIKUR KONSULTAN sebagai konsultan pengawas nya. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 90 hari kalender.



121. Pengembangan SPAM Kelong Kecamatan Bintang Pesisir (1 Paket). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.285.000.000,-. Pekerjaan Pengembangan SPAM Kelong Kecamatan Bintang Pesisir (1 Paket) sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan yang telah dikerjakan meliputi : Penambahan tutup panel , dan penyambungan pipa baru ke rumah warga.





122. Pekerjaan Pembangunan Taman Desa di Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir telah selesai dikerjakan. Pekerjaan Pembangunan Taman Desa di Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir telah selesai dikerjakan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. MANTANG JAYA dengan nilai kontrak Rp. 139.614.000,- dan CV.CITRA PERDANA TEKNIK sebagai konsultan pengawas. Diharapkan taman ini tetap dirawat agar tanaman yang ada selalu terjaga keindahannya.



123. Teralis Rumah Dinas Medis dan Paramedis Puskesmas (115 M<sup>2</sup> x 550.000,-) Numbing, Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.63.250.000,- (Perubahan) Pekerjaan Teralis Rumah Dinas Medis dan Paramedis Puskesmas (115 M<sup>2</sup> x 550.000,-) sedang dikerjakan. Kegiatan ini adalah kegiatan pada APBD-P Tahun 2016, Menurut Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan progres pengerjaan masih dalam tahap pengukuran pintu dan jendela. Ditargetkan pada akhir bulan November teralis sudah terpasang.



## *Kecamatan Seri Kuala Lobam*



124. Pembangunan Drainase Perumahan Lobam Bestari Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (474 M'). Indikasi TA.2016 Rp. 180.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Drainase Perumahan Lobam Bestari Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (474 M') sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV.BINTAN ABADI dengan nilai kontrak Rp.179.862.587,92,-. PT.DUTA ENGINEERING CONSULTANT sebagai konsultan pengawas. Dinas Pekerjaan Umum selaku pelaksana kegiatan agar dapat mengingatkan konsultan untuk membersihkan area drainase dari sisa-sisa bahan bangunan agar lokasi drainase terlihat bersih, dan drainase tidak cepat tersumbat oleh pasir saat hujan turun.



125. Perbaikan Drainase Kp. Suka Damai RT. 02 Rw.02 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (355 M'). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.135.000.000,-. Pekerjaan Perbaikan Drainase Kp. Suka Damai RT. 02 Rw.02 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (355 M') sudah selesai dikerjakan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV.BANDA BENTAN BETUAH dengan nilai kontrak Rp.134.622.921,02,-dan PT.DUTA ENGINEERING CONSULTANT sebagai konsultan pengawasnya. Dalam masa pemeliharaan ini kami menghimbau kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk selalu mengawasi agar drainase ini tetap berfungsi, dikarenakan melihat kondisi jalan yang belum diaspal, dikhawatirkan saat musim hujan saluran drainase ini akan terisi oleh lumpur.

126. Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Gg. Nuri RT. 02 RW. 02 Kec. Seri Kuala Lobam (248 M<sup>2</sup>). Indikasi TA.2016 Rp. 130.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Gg. Nuri RT. 02 RW. 02 Kec. Seri Kuala Lobam (248 M<sup>2</sup>) sudah selesai dikerjakan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV.MARIANI dengan nilai kontrak Rp.127.000.000,-.Konsultan





pengawas pekerjaan ini adalah CV.MIMARVISION ENGINEERING.



127. Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Gg. Meranti Kec. Seri Kuala Lobam (286 M<sup>2</sup>). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.150.000.000,-. Pekerjaan pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Gg. Meranti Kec. Seri Kuala Lobam (286 M<sup>2</sup>), sudah selesai dikerjakan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV.MARIANI dengan nilai kontrak Rp.148.000.000,-.Konsultan pengawas pekerjaan ini adalah CV.MIMARVISION ENGINEERING.





128. Pembangunan Paving Blok Gg. Kertosono menuju Gg. Kemunting Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (311 M<sup>2</sup>). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.100.000.000,-. Pekerjaan pembangunan Paving Blok Gg. Kertosono menuju Gg. Kemunting Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (311 M<sup>2</sup>) , sudah selesai dikerjakan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV.SURYA BINTAN KENCANA dengan nilai kontrak Rp.99.845.341,25,-.Konsultan pengawas pekerjaan ini adalah CV.MIMARVISION ENGINEERING.

129. Pembangunan Paving Blok Gg. Salam menuju Gg. Kemunting Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (345 M<sup>2</sup>). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.110.000.000,-. Pekerjaan pembangunan Paving Blok Gg. Salam menuju Gg. Kemunting Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (345 M<sup>2</sup>), sudah selesai dikerjakan. Tidak ditemukan papan plang pekerjaan.



130. Pembangunan Pagar Polindes Tanjung Permai Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (63 M x 1,5 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.150.000.000,-. Pekerjaan pembangunan pagar polindes Tanjung Permai Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (63 M x 1,5 M), sudah selesai dikerjakan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV. BINTAN ABADI dengan nilai kontrak Rp.149.900.000,-. Konsultan pengawas pekerjaan ini adalah CV. KARYA RUPADHATU.



131. Teralis Polindes Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam (60 M2 x 550.000,00). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.33.000.000,-. Pekerjaan teralis polindes Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam (60 M2 x 550.000,00). Belum dilaksanakan.



132. Pembangunan Batu Miring Posyandu Jalan Cendrawasih VII Blok B Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (90 M x 1 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.150.000.000,-. Pekerjaan pembangunan batu miring posyandu Jalan Cendrawasih VII Blok B Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (90 M x 1 M), sudah selesai dikerjakan.



133. Pemasangan instalansi listrik dan penyambungan daya listrik Posyandu Tanjung Permai dan Posyandu Tanjung Emas Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.20.000.000,-. Pekerjaan pemasangan instalansi listrik dan penyambungan daya listrik Posyandu Tanjung Permai dan Posyandu Tanjung Emas Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam, sudah selesai dikerjakan. Tidak ada kendala terkait pemasangan instalasi listrik Posyandu Tanjung Permai.



134. Pemasangan instalansi listrik dan penyambungan daya listrik gedung Workshop Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.20.000.000,-. Pekerjaan pemasangan instalansi listrik dan penyambungan daya listrik gedung Workshop Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam, sudah selesai dikerjakan. Tidak ada kendala terkait pemasangan instalansi listrik pada gedung Workshop Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Permai. Dengan adanya listrik kegiatan Karang Taruna diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

135. Pembangunan Batu Miring Penahan Tanah Belakang Sekolah SMPN 16 Bintan Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (41 M x 4 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.208.750.000,-. Pekerjaan Pembangunan Batu Miring Penahan Tanah Belakang Sekolah SMPN 16 Bintan Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (41 M x 4 M) , sudah selesai dikerjakan. Pelaksana



pekerjaan ini adalah CV.BANDA BENTAN BETUAH dengan nilai kontrak Rp.202.020.894,22,-. Konsultan pengawas pekerjaan ini adalah CV.KHASANAH CIPTA CONSULTANT. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 120 hari kalender. Melihat kondisi tanah yang rawan memang diperlukan pembangunan batu miring ini. Dengan adanya batu miring tanah disekitar bangunan sekolah dapat mencegah dari longsor.



136. Pemeliharaan Taman Kota Seri Kuala Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.25.000.000,-. Pekerjaan pemeliharaan Taman Kota Seri Kuala Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam sudah selesai dikerjakan. Sebagai ruang publik keberadaan taman ini sudah seharusnya selalu dijaga kebersihannya agar semua sarana yang ada pada taman ini selalu dapat digunakan dengan baik..





137. Pengadaan Alat Permainan Anak-Anak di Taman Kota Seri Kuala Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.140.000.000,-. Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Anak-Anak di Taman Kota Seri Kuala Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam sudah selesai dikerjakan. Alat permainan yang ada sudah dapat digunakan.



138. Pengembangan SPAM IKK Seri Kuala Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam (1 Paket). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.1.591.475.000,-. Pekerjaan Pengembangan SPAM IKK Seri Kuala Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam (1 Paket) sedang dikerjakan.





139. Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan Kp. Pelita Baru Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam (1 Paket). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.712.500.000,-. Pekerjaan Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan Kp. Pelita Baru Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam (1 Paket) sudah selesai dikerjakan.



140. Pemasangan instalansi listrik dan penyambungan daya listrik Gedung SMK Negeri 4 Bintang di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.45.000.000,-. Pekerjaan pemasangan instalansi listrik dan penyambungan daya listrik Gedung SMK Negeri 4 Bintang di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam sedang dikerjakan. Dari keterangan Tim dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan dapat di informasikan bahwa saat ini pemasangan sedang menunggu konfirmasi dari PLN Bintan untuk dsegera dikerjakan. Diharapkan pemasangan dapat selesai tepat waktu.

141. Pembangunan Pagar TPU Desa Kuala Sempang di Jalan Lintas Barat. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.285.000.000,-. Pekerjaan pembangunan pagar TPU Desa Kuala Sempang di jalan lintas barat sudah selesai dikerjakan.



142. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Seri Kuala Lobam (6 Ruang) Kuala Sempang Kelurahan Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.605.910.000,- Pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Seri Kuala Lobam (6 Ruang) Kuala Sempang Kelurahan Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam sudah selesai dikerjakan.

## *Kecamatan Teluk Sebong*



143. Peningkatan Kualitas rumah swadaya Desa Sebong Perekh di Kecamatan Teluk Sebong. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.600.000.000,-. Pekerjaan Peningkatan Kualitas rumah swadaya Desa Sebong Perekh di Kecamatan Teluk Sebong sudah selesai dikerjakan. Dapat dilaporkan bahwa pada T.A 2016 ini rencananya akan dilakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 40 rumah. Salah satu rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya seperti yang kami laporkan pada gambar berikut.



144. Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Pecah Gelas Desa Sebung Lagoi Kec. Teluk Sebung (1.890 M<sup>2</sup>). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.980.000.000,-. Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Pecah Gelas Desa Sebung Lagoi Kec. Teluk Sebung (1.890 M<sup>2</sup>) , sudah selesai dikerjakan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV.EXIM STAR dengan nilai kontrak Rp.929.554.390,43 dan konsultan pengawas PT.GRAHA ADIGUNA KONSULTAN.

145. Pembangunan Drainase /Parit RT.03 RW.02 Desa Sebung Lagoi Kec Teluk Sebung (602 M<sup>2</sup>). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.225.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Drainase /Parit RT.03 RW.02 Desa Sebung Lagoi Kec Teluk Sebung (602 M<sup>2</sup>) sudah selesai dikerjakan. Dapat dilaporkan bahwa drainase yang akan dibangun ada pada dua sisi jalan, dimana pada sisi kanan jalan merupakan pembangunan drainase yang baru,



sementara di sisi kiri jalan meneruskan drainase yang sudah ada.



146. Pembangunan Drainase/Parit Jalan Pasar Baru RT.04 RW.01 Desa Seborg Lagoi Kec Teluk Seborg (500 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.332.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Drainase/Parit Jalan Pasar Baru RT.04 RW.01 Desa Seborg Lagoi Kec Teluk Seborg (500 M) sedang dikerjakan. Pekerjaan sampai saat ini masih berlangsung. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV. SUMBER MULIA dengan nilai kontrak Rp.314.776.134,82,- dan CV.MULTI DESEKO sebagai konsultan pengawas. Tim kembali mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk menggesa pekerjaan dikarenakan sudah memasuki bulan November.



147. Pembangunan/pengaspalan Jalan Kel. Kota Baru - Kp. Beringin Kec. Teluk Sebong (500 M). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.1.875.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan/pengaspalan Jalan Kel. Kota Baru - Kp. Beringin Kec. Teluk Sebong (500 M) sudah selesai dikerjakan. Pembangunan Jalan satu paket dengan drainase.



148. Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Desa E kang Anculai Kec. Teluk Sebong (382 M<sup>2</sup>). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.200.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Semeniasi Buras Beton Bertulang Desa E kang Anculai Kec. Teluk Sebong (382 M<sup>2</sup>) sudah selesai dikerjakan.



149. Pembangunan pagar SMAN 4 Bintang ( Pagar besi 110 M<sup>2</sup> dan pagar tembok 55 M<sup>2</sup> Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 54) Kelurahan Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong . Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.127.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan pagar SMAN 4 Bintang ( Pagar besi 110 M<sup>2</sup> dan pagar tembok 55 M<sup>2</sup> Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 54) Kelurahan Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong sudah selesai dikerjakan. Pagar yang dibangun pada tahun 2016 menurut Dinas Pekerjaan Umum adalah pagar didepan sekolah.





150. Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Senggiling Desa Sri Bintang Kec Teluk Sebong (382 M<sup>2</sup>). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.200.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Senggiling Desa Sri Bintang Kec Teluk Sebong (382 M<sup>2</sup>) sudah selesai dikerjakan.



151. Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong (1 Paket). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.475.000.000,-. Pekerjaan Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong (1 Paket) sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan optimalisasi ini meliputi penggantian pipa baru agar SPAM dapat melayani warga lebih optimal.



152. Pembuatan Pagar dan Pintu Sekolah SDN 005 Teluk Sebong Jl. Pengudang Kelurahan Pengudang Kec. Teluk Sebong. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.300.000.000,-. Pekerjaan Pembuatan Pagar dan Pintu Sekolah SDN 005 Teluk Sebong Jl. Pengudang Kelurahan Pengudang Kec. Teluk Sebong sudah selesai dikerjakan. Pelaksana Pekerjaan ini adalah CV.MAHARDIKA PERDANA dengan nilai kontrak Rp.179.977.925,-.



153. Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.285.000.000,-. Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong sedang dikerjakan, Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pembuatan kolam dan penyambungan pipa. Pekerjaan pembuatan kolam dan penyambungan pipa sudah selesai dikerjakan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV.PRIBUMI JAYA MANDIRI dengan nilai kontrak Rp.266.415.314,24,- dan CV.KREASI CEMERLANG KONSULTAN sebagai konsultan pengawas.

154. Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah(IPAL Komunal) Desa Berakit Kec. Teluk Sebong. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.605.910.000,-. Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah(IPAL Komunal) Desa Berakit Kec. Teluk Sebong dalam tahap finishing pekerjaan. IPAL yang akan dibangun nantinya akan digunakan oleh 20 KK. Diingat



kembali kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawasi pekerjaan yang berlangsung agar dapat memastikan nilai bangunan yang dikerjakan berkualitas baik. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pipa sambungan seperti yang ditemukan pada pembangunan IPAL sebelumnya.



155. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Bukit Balau Desa Berakit Kec. Teluk Sebong. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.3.706.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan/Pengaspalan Jalan Bukit Balau Desa Berakit Kec. Teluk Sebong sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan ini satu paket juga dengan pembangunan drainase, yang juga sudah selesai dikerjakan. Pelaksana Pekerjaan ini adalah PT.EKA PUTRA SAKTI dengan nilai kontrak Rp.3.687.937.425,84,- dan PT.CALVINDAM JAYA EC sebagai konsultan pengawas. Pekerjaan ini diharapkan selesai sesuai dengan target waktu yang ditetapkan pada kontrak.





156. Penambahan daya listrik pabrik es Berakit di desa Berakit Kec. Teluk Sebong. Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.200.000.000,-. Pekerjaan Penambahan daya listrik pabrik es Berakit di desa Berakit Kec. Teluk Sebong sudah selesai dilaksanakan.



157. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (15.000 M) ( Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Timur, Kec Teluk Bintan dan Kec. Toapaya) Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.450.000.000,- . Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 15.000 M untuk lokasi di Kec. Teluk Sebong, sudah selesai dilaksanakan.



158. Pengadaan rambu lalu lintas lokasi di 5 kecamatan (Kec. Bintan Timur, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Sebong). Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.90.000.000,-. Pekerjaan Pengadaan rambu lalu lintas lokasi di 5 kecamatan di desa Berakit Kec. Teluk Sebong sudah selesai dilaksanakan.



159. Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Gg.Karet RT.01 RW 04 Poyotomo Desa Sri Bintang Kec.Teluk Sebong (230 M<sup>2</sup>) Indikasi Tahun Anggaran 2016 Rp.95.000.000,-. Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Gg.Karet RT.01 RW 04 Poyotomo Desa Sri Bintang Kec.Teluk Sebong (230 M<sup>2</sup>) sudah selesai dikerjakan. Kegiatan ini masuk dalam anggaran perubahan dan menurut Dinas Pekerjaan Umum tidak terdapat kendala dalam penyelesaian pekerjaan.

## *Kecamatan Tambelan*



160. Peningkatan Jalan Raya Pulau Tambelan Kec. Tambelan (Lanjutan) (1,25 Km) Kec. Tambelan, Pagu dana pada DPA Tahun 2016 sebesar Rp. 3.126.350.000,00. Kegiatan ini merupakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan nilai pada DPA sebesar Rp. 3.126.350.000,00,- Menurut pemantauan di lapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Raya Pulau Tambelan Kecamatan Tambelan (Lanjutan) sepanjang 1,25 Km sangat diperlukan memandang jalan yang ada sudah tidak layak dan banyak yang sudah berlubang. Terlebih lagi kontur tanah yang landai pada sisi jalan yang melewati jurang yang cukup dalam tentunya sangat berbahaya bila terjadi hujan dan berpotensi longsor. Saat dilakukan monitoring sedang dalam tahap pengerjaan pengecoran semen / beton bertulang. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.





161. Pembangunan Pagar SMP Kec. Tambelan (90 M'). Pagu dana pada DPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.170.000.000,00. Kegiatan ini merupakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan nilai pada DPA sebesar Rp.170.000.000,00 . Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan pembangunan pagar tersebut telah selesai dikerjakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan kondisi baik.



162. Pembangunan Mushollah SMU Kec.Tambelan (1 Paket), Pagu dana pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.152.000.000,00. Pekerjaan ini merupakan urusan wajib Pekerjaan Umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, dengan pagu dana sebesar Rp.152.000.000,00. Menurut pemantauan dilapangan pekejaan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan kondisi baik.



163. Pembangunan Sarana Air Bersih SD. 02 Tambelan Kec. Tambelan (1 Paket). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.37.500.000,00. Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan telah selesai dikerjakan. Namun hasil dari penilaian Tim terhadap pekerjaan yang dilaksanakan masih kurang baik. Karena pipa terlihat belum tertanam dengan baik, dikhawatirkan pipa tersebut akan rusak bilamana terinjak oleh siswa maupun masyarakat yang lalu lalang disekitar lokasi pekerjaan. Terlebih lagi sekolah belum memiliki pagar pembatas. Untuk itu



*disarankan kepada pelaksana pekerjaan tersebut agar segera memperbaikinya.*



164. Pengembangan SPAM Pulau Tambelan Kec. Tambelan. Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.849.452.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat untuk mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan khususnya warga masyarakat di Kecamatan Tambelan. Disamping itu juga meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat dilakukan monitoring, kegiatan pembangunan dalam tahap pengerjaan pemasangan pipa distribusi air bersih ke rumah masyarakat. Tim mengharapkan agar pendistribusian air ini segera diselesaikan mengingat pentingnya kebutuhan air bersih khususnya di Kecamatan Tambelan. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.





165. Pembangunan Pagar MTS Kec. Tambelan (91 M'). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.180.000.000,00. Menurut informasi PPTK pekerjaan tersebut masuk dalam daftar tunda (pending) untuk Tahun Anggaran 2016.

166. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat untuk mendukung Operasional Kantor Kecamatan Tambelan di Tambelan.. Pagu dana DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000,00. Pembangkit listrik bertenaga surya merupakan fasilitas yang sangat diperlukan oleh Kantor Kecamatan mengingat suplai listrik PLN yang ada hanya tersedia lk. 18 jam (jam 17.00 s.d 07.00). Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan dan



elayanan masyarakat dengan dukungan listrik tenaga surya telah dapat berjalan dengan baik. Aparatur kecamatan sudah bisa bekerja melayani masyarakat dengan dukungan listrik bertenaga surya tersebut.



167. Optimalisasi Jaringan Sarana Air Bersih Dari Desa Kukup Menuju Pelabuhan Sri Bentayan Kec. Tambelan (Perpipaan 3000 M). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.330.000.000,00. *Pekerjaan optimalisasi jaringan sarana air bersih ini merupakan peningkatan pelayanan distribusi air bersih kepada warga masyarakat berupa pemasangan jaringan pipa sepanjang jalan wilayah Desa Kukup hingga menuju pelabuhan Sri Bentayan. Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan dalam tahap pelaksanaan. Pekerjaan yang sedang dilakukan adalah penggalian jalur pada sisi jalan untuk pemasangan pipa. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.*





168. Pemeliharaan Pelabuhan Sri Bentayan Kec. Tambelan. Pagu dana DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.12.000.000,00. Pada saat dilakukan monitoring pekerjaan sedang dalam tahap pelaksanaan. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.



169. Pembangunan Jalan Semenisi Buras Beton Bertulang Jalan Lancang Desa Teluk Sekuni Kec.Tambelan (528 M2). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.380.000.000,00. Menurut pemantauan



*dilapangan pekerjaan dalam tahap pelaksanaan. Pekerjaan yang sedang dilakukan adalah pembesian dengan model cakar ayam untuk bahu jalan. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini telah memasuki musim hujan dan tentunya akan berpotensi memperlambat penyelesaian pekerjaan.*



170. Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Bertulang Teluk Abek Desa Batu Lepuk Kec.Tambelan (250 M2). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.180.000.000,00. Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal dengan hasil yang cukup baik. Jalan sudah dapat digunakan oleh masyarakat.





171. Pembangunan Jalan Semenisi Buras Beton Bertulang menuju Makam dan SDN 002 RT 006 RW 003 Desa Kp. Hilir Kec. Tambelan (252 M2). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.181.365.000,00. Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal dengan hasil yang cukup baik. Jalan sudah dapat digunakan oleh masyarakat.



172. Pembangunan Semenisi Buras Beton Bertulang Batu Parang RT. 06 RW. 03 Desa Kp. Hilir Kec. Tambelan (250 M2). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.180.000.000,00. Menurut pemantauan dilapangan pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai jadwal dengan hasil yang cukup baik. Jalan sudah dapat digunakan oleh masyarakat.



## *Kecamatan Teluk Bintan*



173. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Bintan (600 M) Kec. Teluk Bintan, Pagu dana pada DPA Tahun 2016 sebesar Rp. 2.129.000.000,00. Kegiatan ini merupakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan nilai pada DPA sebesar Rp.2.129.000.000,00 Menurut Pemantauan di Lapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pembangunan/ Pengaspalan Jalan Kawasan Ibu Kota tersebut masih dalam pengerjaan dan tahap penyelesaian.





174. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kemalai - Lintas Barat Kec. Teluk Bintang (2 Km). Pagu dana pada DPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.7.700.000.000,00.

*Kegiatan ini merupakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan nilai pada DPA sebesar Rp.7.700.000.000,00 . Pada saat monitoring di lapangan,pekerjaan masih pada pengerasan dan penimbunan jalan, dan dilanjutkan dengan pengaspalan, Diharapkan dinas terkait menggesa pekerjaan tersebut karena mendekati tahap penyelesaian.*



175. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Nuri - Kawasan Pusat Pemerintahan Bandar Seri Bentan Kec. Teluk Bintang (2 Km), Pagu dana pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.8.102.500.000,00. Pekerjaan ini merupakan urusan wajib Pekerjaan Umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, dengan pagu dana sebesar Rp.8.102.500.000,00. Pada saat monitoring dilapangan tampak pekerjaan masih pada pengerjaan gorong - gorong dan di lanjutkan ke pengaspalan.



176. Pembangunan Halte Angkutan Umum di Kabupaten Bintan (Lokasi : SMPN 06 Kec.Teluk Bintan, Depan SMUN 03 Kec. Teluk Bintan, SDN 014/SMPN 26 satu atap Wacopek. Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.160.000.000,00. *Pembangunan Halte Angkutan Umum di Kec. Teluk Bintan merupakan urusan wajib Perhubungan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, dengan pagu dana sebesar Rp.160.000.000,00 .Sebanyak 2 halte yang dibangun di kec. Teluk Bintan. Pekerjaan ini telah selesai dikerjakan yang lokasinya tepat didepan mesjid raya kecamatan Teluk Bintan. Diharapkan Halte ini dapat di gunakan untuk kepentingan masyarakat.*



177. Pengadaan Rambu Lalu Lintas ,lokasi di 5 kecamatan ( Kec.Bintan Timur,Kec.Toapaya,Kec.Teluk Bintan,Kec.Gunung Kijang,Kec.Teluk Sebung). Pagu dana DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.90.000.000,00. *Pengadaan Rambu Lalu Lintas ,lokasi di 5 kecamatan ( Kec.Bintan Timur,Kec.Toapaya,Kec.Teluk Bintan,Kec.Gunung Kijang,Kec.Teluk Sebung) merupakan urusan wajib Perhubungan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, dengan pagu dana sebesar Rp.90.000.000,00. Pekerjaan ini belum dikerjakan. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dapat menggesa pekerjaan tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kepada masyarakat untuk dapat menjaga rambu lalu lintas yang sudah dipasang tersebut.*

178. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (15.000M') lokasi 4 kecamatan, ( Kec. Teluk Sebung, Kec. Bintan Timur, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya ). Pagu dana DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.450.000.000,00. *Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (15.000M') lokasi 4 kecamatan, ( Kec. Teluk Sebung, Kec. Bintan Timur, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya ) merupakan urusan wajib Perhubungan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, dengan pagu*




*dana sebesar Rp.450.000.000,00 dengan volume seluas 15.000 M' .Dari hasil pantauan dilapangan tampak pekerjaan telah selesai dikerjakan.*



179. *Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tower di Kec. Teluk Bintang (1 Unit). Pagu dana DPA Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000,00. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tower di Kec. Teluk Bintang (1 Unit) merupakan urusan wajib Lingkungan Hidup yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan di lapangan pekerjaan masih dalam tahap pengecoran tapak / pondasi lampu tower.*



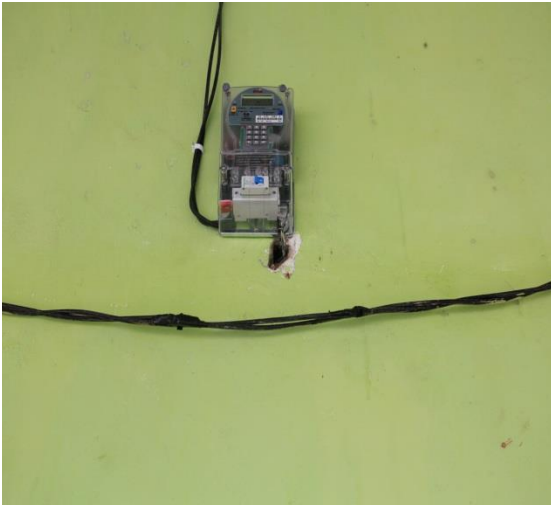

180. Pemasangan instalasi listrik dan penyambungan daya listrik SDN 010, SDN 011, SDN 013 Kecamatan Teluk Bintang. Pagu dana DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.100.000.000,00. *Pemasangan instalasi listrik dan penyambungan daya listrik SDN 010, SDN 011, SDN 013 Kecamatan Teluk Bintang merupakan urusan wajib Lingkungan Hidup yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan tim monitoring dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pemasangan instalasi listrik ini telah selesai dikerjakan dan dapat difungsikan.*





181. Pembangunan Jalan Paving Blok Mawar RT. 07/RW. 04 dan RT. 06/RW. 03 Desa Pangkil Kec. Teluk Bintang (670 M<sup>2</sup>). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.254.000.000,00. *Pembangunan Jalan Paving Blok Mawar RT. 07/RW. 04 dan RT. 06/RW. 03 Desa Pangkil Kec. Teluk Bintang (670 M<sup>2</sup>) merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai di kerjakan dan di harapkan dapat di gunakan untuk kepentingan masyarakat.*



182. Pembangunan Paving Blok Jalan Lapangan RT. 12 RW. 06 Tg. Kudus Desa Pangkil Kec. Teluk Bintang (371 M<sup>2</sup>). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.140.625.000,00. *Pembangunan Paving Blok Jalan Lapangan RT. 12 RW. 06 Tg. Kudus Desa Pangkil Kec. Teluk Bintang (371 M<sup>2</sup>) merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan, dari pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan telah selesai dan dapat di gunakan untuk kepentingan masyarakat.*





183. Pembangunan Pagar TPU RT. 05 RW. 03 Tanjung Keramat Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintang. Pagu dana DPA Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.186.500.000,00. *Pembangunan Pagar TPU RT. 05 RW. 03 Tanjung Keramat Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintang merupakan urusan wajib lingkungan hidup yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, dengan nilai total pagu dana pada DPA sebesar Rp. 186.500.000,00. Di Kecamatan Teluk Bintang pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.*





184. Pembangunan Pagar TPU Dusun III Tanjung Kudus RT. 09 RW. 05 Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan. Pagu dana DPA Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.95.000.000,00. *Pembangunan Pagar TPU Dusun III Tanjung Kudus RT. 09 RW. 05 Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan merupakan urusan wajib Lingkungan hidup yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan, dari pantauan dilapangan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan.*



185. Teralis Polindes Pangkil Kecamatan Teluk Bintan (60 M2 x 550.000,00). Pagu dana DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.33.000.000,00. Teralis Polindes Pangkil Kecamatan Teluk Bintan (60 M2 x 550.000,00). Merupakan urusan wajib Kesehatan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, pekerjaan ini telah selesai di laksanakan saat Tim Monitoring turun di lapangan.



186. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 003 Teluk Bintang (4 Ruang) Tanjung Quddus Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintang. Pagu dana DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.180.000.000,00. *Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 003 Teluk Bintang (4 Ruang) Tanjung Quddus Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintang merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan tim monitoring pekerjaan ini telah diselesaikan.*



187. Pembangunan Badan Jalan SDN. 006 Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang (400 M). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.675,000,000,00. *Pembangunan Badan Jalan SDN. 006 Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang (400 M) merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan tim monitoring tampak pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan.*



188. Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang (382 M2). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000,00. *Dari hasil pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang (382 M2), telah selesai dikerjakan.*



189. Pembangunan Pelantar penghubung Keter laut - keter tengah Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan (360 M x 2 M). Pagu Dana Rp.1.819.682.000,00. Pembangunan Pelantar penghubung Keter laut - keter tengah Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan (360 M x 2 M) pantauan Tim Monitoring di lapangan, pekerjaan pada Tahap Akhir penyelesaian, tinggal pemasangan dan pengecatan pagar pelantar.



190. Optimalisasi SPAM RT. 02 RW. 05 Kp. Mansur Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang (1 Paket). Pagu Dana Rp. 220.000.000,00. *Dari hasil pemantauan tim dilapangan dapat dilaporkan bahwa Optimalisasi SPAM RT. 02 RW. 05 Kp. Mansur Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang (1 Paket), telah selesai dikerjakan dan dapat di operasionalkan, karena sudah mengganti water tank pada tower pertama.*



191. Pembangunan dan Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal) Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang. Pagu Dana Rp.479,436,000,00,-. *Pembangunan dan Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal) Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang sesuai pantauan tim monitoring di lapangan, pekerjaan masih berlangsung pada tanki penampungan limbah.*



192. Pembangunan tempat parkir kendaraan bermotor Kantor Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintang. Pagu Dana Rp. 10.000.000,-. Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pembangunan tempat parkir kendaraan bermotor Kantor Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintang telah selesai dikerjakan.





193. Peningkatan/Pengaspalan Jalan Kp. Banse (Lanjutan) Desa Penaga Kec. Teluk Bintang (270 M) dengan Pagu Anggaran Rp. 731.910.000,-. *Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Peningkatan/Pengaspalan Jalan Kp. Banse (Lanjutan) Desa Penaga Kec. Teluk Bintang (270 M) telah selesai dikerjakan..*



194. Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Kampung Belak Desa Penaga Kec. Teluk Bintang (382 M<sup>2</sup>) dengan Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00,-. *Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Kampung Belak Desa Penaga Kec. Teluk Bintang (382 M<sup>2</sup>) sudah selesai dikerjakan.*



195. Pembangunan Pagar SD 005 Desa Penaga Kec. Teluk Bintang (126 M') dengan Pagu Anggaran Rp. 180.000.000,00,-. Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar SD 005 Desa Penaga Kec. Teluk Bintang (126 M') telah selesai di kerjakan.





196. Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Penaga Teluk Bintan (1 Paket) dengan Pagu Anggaran Rp. 475.000.000,00,-. *Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Optimalisasi dan Pengembangan SPAM Desa Penaga Teluk Bintan (1 Paket) masih dalam pengerjaan dan mendekati Tahap akhir penyelesaian.*



197. Pematangan Lahan Bumi Perkemahan Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan (1 Paket) dengan Pagu Anggaran Rp.197.000.000,00 merupakan Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2016. Dari hasil pantauan Tim Monitoring di lapangan proses pematangan lahan Masih berlangsung, dan mendekati tahap akhir penyelesaian.



198. Belanja pemeliharaan lampu jalan Antik 8 buah di Kawasan Ibukota Pemerintahan dan lampu jalan Ornament Antik Sekabupaten Bintan 7 buah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 kegiatan ini masuk dalam Anggaran Perubahan Tahun 2016, yang merupakan wewenang DKPP. Pantauan Tim Monitoring di lapangan pemeliharaan Lampu Jalan Antik sudah dilaksanakan.



199. Belanja pemeliharaan lampu jalan 4 Ornament ( Kec. Bintang Timur 3 buah, Kec. Bintang Utara 3 Buah, Kec. Teluk Sebong 1 buah, Kec. Teluk Bintang 1 Buah, Kec. Gunung Kijang 2 buah, Kec. Toapaya 1 buah) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 merupakan kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2016, yang merupakan wewenang DKPP. Sesuai pantauan Tim Monitoring dilapangan pekerjaan pemeliharaan lampu Jalan 4 Ornament di Kec. Teluk Bintang telah selesai dikerjakan.

## *Kecamatan Bintan Timur*



200. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Km. 17 LP - Kp. Banjar Lama Kec. Bintan Timur (750 M) dengan Anggaran sebesar Rp. 2.956.000.000,-. Bahwa kondisi eksisting saat ini pembangunan/pengaspalan jalan sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan oleh masyarakat sekitar.






201. Pembangunan/Peningkatan Jalan Musi Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (2,5 Km) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 7.102.854.000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini pembangunan/peningkatan jalan Musi masih dalam pelaksanaan pekerjaan dimana sebagian pekerjaan sudah selesai dan difungsikan oleh masyarakat.
- Berdasarkan hasil pengamatan, pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dimulai dari arah jalan Korindo menuju kearah jalan Nusantara.



202. Peningkatan/Overlay Jalan Sp. Tugu Antam - Mini Zoo - Kolong Enam - Lengkuas kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur (3 Km) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 4,012,546,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini Peningkatan/Overlay Jalan Sp. Tugu Antam - Mini Zoo - Kolong Enam - Lengkuas kel. Kijang Kota sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan oleh masyarakat sekitar.

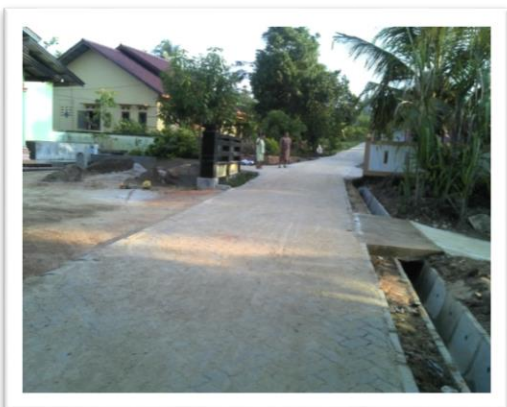


203. Pembangunan Drainase/Parit Gg. Merdeka - Gg. Makmur RT. 004 RW. 002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (688 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 260,000,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini kegiatan dimaksud sebagian besar telah dikerjakan, dan hanya tinggal sedikit proses finishing dan pembersihan.



204. Pembangunan Drainase RT. 02 RW. 22 (Samping Masjid Nurul Mubin) Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (284 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 107,250,000.-
- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.

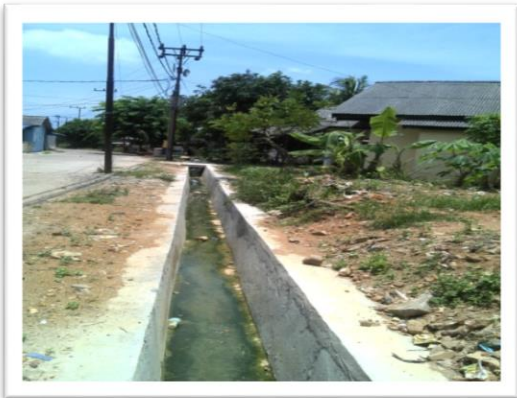

205. Pembangunan Drainase RT. 02 RW. 13 Perumnas Tekojo Kel.Kijang Kota Kec.Bintan Timur (237 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 90,000,000.-.
- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
JALAN RAJA TALUNGPINANG - TALUNG IBAN KM 42  
BANDAR SERI BENTAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN  
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN DRAINASE RT02 RW 13 PERUMNAS TEKOD  
KEL. KIJANG KOTA KEC. BINTAN TIMUR (237 M')

PELAKSANA : CV. KHARISMA SEJATI  
NILAI KONTRAK : Rp. 90.000.000,-  
KONSULTAN : CV. DIKENTAMA ANGEERING CONSULTANT  
WKT. PELAKSANAAN : 90 ( SEMBELAN PULUH ) HARI KALENDER  
SUMBER DANA : APBD KAB. BINTAN TAHUN ANGGARAN 2016

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KELU

206. Pembangunan Drainase RT. 02 RW. 22 Gg. Kesuma 2 Kp. Kolong Enam Kel.Kijang Kota Kec.Bintan Timur (237 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 90,000,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



207. Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 06 Jalan Sri Bay Intan Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (474 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 185,000,000,-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.







208. Pembangunan Pelantar Beton Gg. Nelayan RT. 3 RW. 17 Kp. Kolam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (53 M x 1,5 M) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 180,000,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



209. Pembangunan Pelantar Rakyat Desa Batu Licin Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (40 M x 2 M) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 180,000,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



210. Pembangunan Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Makmur dan Gg. Bersama RT. 04 RW.02 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (592 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 190,600,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.





211. Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Mawar RT. 05 RW.01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (1.099 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 354,000,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



212. Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Mawar RT. 05 RW.01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (1.099 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 354,000,000.-.


- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



213. Pembangunan Pembangunan Jalan Paving Blok Halaman TPQ Nurul Qomar Kp. Sido Mulyo RT. 02 RW. 05 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (311 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 100,000,000.-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



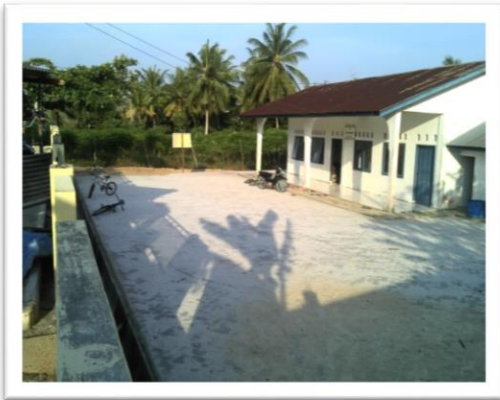

214. Pembangunan Pembangunan Jalan Paving Blok Halaman TPQ Nurul Qomar Kp. Sido Mulyo RT. 02 RW. 05 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (311 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 100,000,000.-.
- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



215. Pembangunan Paving Blok Jalan Korindo Kp. Jawa Gg. Natuna 1 RT. 01 RW. 02 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (559 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar 180,000,000,-.
- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



216. Pembangunan Paving Blok RT. 002 RW. 001 Kp. Telaga Biru Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (435 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 140,000,000,-.
- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



217. Pembangunan Paving Block GG. Bahrul Ulum RT 02 RW 02 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (559 M<sup>2</sup>) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 18,000,000,-.

- Pembangunan Paving Block GG. Bahrul Ulum RT 02 RW 02 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (559 M<sup>2</sup>) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 18,000,000,- sudah selesai dikerjakan.



218. Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Musi Gg. Sepat Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (Lanjutan)(248 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 130,000,000,-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



219. Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Akasia RT. 03/RW. III KM 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (191 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 100,000,000,-.

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.








220. Pembangunan Paving Block Gg. Sei Jati I RT 01 RW 01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (450 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 145,000,000,-
- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



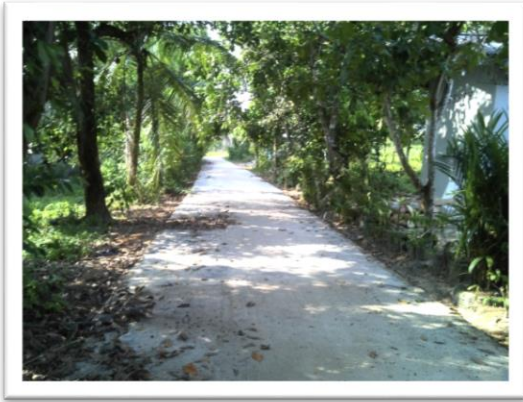

221. Pembangunan Paving Block Gg. Cempaka RT 04 RW 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (668 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 215,125,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



222. Pembangunan Paving Block Gg. Wisata I RT 04 RW 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (322 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 103,750,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.





223. Pembangunan Paving Block Gg. Jahe RT 4 RW 2 Kel. Kijang Kota Kec.Bintan Timur (Lanjutan)(365 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 117,500,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



224. Pembangunan Paving Block Gg. Asyura RT 1 RW 3 Kel.Gunung Lengkuas Kec.Bintan Timur (284 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 91,375,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



225. Pembangunan Paving Block Gg Rawa Indah RT 2 RW 2 Bangun Rejo Kel.Gunung Lengkuas Kec.Bintan Timur (553 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 178,000,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.





226. Pembangunan Paving Block Gg Mawar 2 Kp. Baru RT 2 RW 1 Kel.Sei Lekop Kec.Bintan Timur (365 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 117,500,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.





227. Pembangunan Paving Block RT 01 RW 01 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (528 M<sup>2</sup>) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 170,000,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



228. Pembangunan Paving Block RT 01 RW 01 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (528 M<sup>2</sup>) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 170,000,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.





229. Pembangunan Jalan Semenisi Buras Beton Bertulang Perum Octaviary - Garuda Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (344 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 180,000,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



230. Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Bertulang gg Mawar RT. 03 RW 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec.Bintan Timur (420 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 220,000,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



231. Pembangunan Semenisasi Buras Beton Bertulang Jalan Nusantara KM. 20 Gg. Melati RT. 03/RW. 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (390 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 200,000,000,-

- Berdasarkan hasil pengamatan, pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dimulai dari arah dalam jalan menuju kearah luar yaitu jalan






Nusantara dan saat ini sudah selesai dilaksanakan.



232. Pembangunan Paving Block Halaman SD 009 Km. 18 Kel.Gunung Lengkuas Kec.Bintan Timur (359 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 115,750,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.

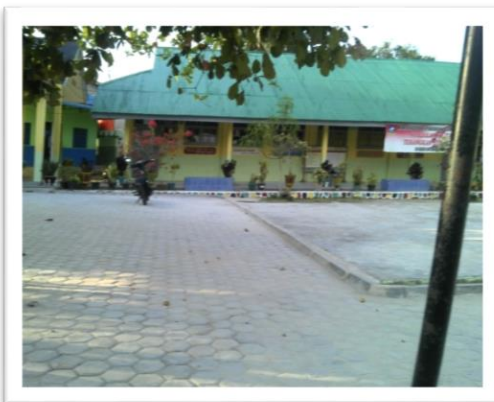



233. Pembangunan Paving Block Lapangan Upacara SMP 4 Kijang Kec. Bintang Timur (559 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 180.000.000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



234. Pembangunan Paving Block Halaman SMP 3 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (450 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 145,000,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.





235. Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 018 Desa Batu Licin Kel. Gunung Lingsuas Kec. Bintan Timur (1 Unit) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 128,000,000,-

- Bahwa kondisi eksisting saat ini Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 018 Desa Batu Licin sudah selesai dilaksanakan.





236. Pembangunan SPAM RT. 04 RW. 02 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (1 Paket) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 207,500,000,-

- Berdasarkan hasil pengamatan, Pembangunan SPAM RT. 04 RW. 02 Kel. Sei Lekop sudah selesai dilaksanakan.



237. Pembangunan SPAM Pedesaan RT. 03 RW. 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur (1 Paket) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 207.500.000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini sudah selesai dilaksanakan namun dari informasi warga bahwa proyek pembangunan SPAM tersebut dianggap tidak sempurna penyelesaiannya karena terlihat bekas galian yang tidak



dirapikan, dan pemasangan pipa yang mengganggu aliran drainase.



238. Pembangunan Toilet Umum lapangan Olah Raga Kijang Kota dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 380,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud s telah selesai dilaksanakan.





239. Pembangunan Toilet Umum Taman Kota Kijang dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 380,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan.



240. Pembangunan Drainase Jalan Musi RT. 01 RW. 03 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur (350 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 230,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan.





241. Pembangunan Drainase Perumahan Tirta Kencana Jalan Nusantara Km. 18 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (350 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 230,000,000,-
- Bahwa kondisi lapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan.



242. Pembangunan Drainase Jalan Nusantara KM. 20 RT. 03 RW. 03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (340 M') dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 120,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah hampir selesai dilaksanakan.



243. Pembangunan Drainase Jalan Musi RT. 02 RW. 03 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (374 M2) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 120,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai pelaksanaan pekerjaannya.





244. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Posyandu RT.01/RW.11 Kp. Baru Keke Kel.Kijang kota Kec. Bintang Timur dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 10,000,000, -
- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan.



245. Pembangunan Halte Angkutan Umum di Kabupaten Bintan (Lokasi : SMPN 06 Kec.Teluk Bintan, Depan SMUN 03 Kec. Teluk Bintan, SDN 014/SMPN 26 satu atap Wacopek dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 160,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



246. Pengadaan Rambu Lalu Lintas ,lokasi di 5 kecamatan ( Kec.Bintan Timur,Kec.Toapaya,Kec.Teluk Bintan,Kec.Gunung Kijang,Kec.Teluk Sebong) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 90,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



247. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (15.000M') lokasi 4 kecamatan, ( Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Timur, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya ) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 450,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



248. Rehabilitasi Dermaga Pantai Indah ( 24 X 4 ) + T ( 6 X 8 ) + Ruang Tunggu dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 753,840,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



249. Pembangunan Majelis Guru SDN 018 Bintang Timur dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 170,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan dan difungsikan.



250. Pembangunan gedung UPT PAUS di kecamatan Bintang Timur dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 324,800,000, -
- Bahwa kondisi dilapangan saat ini masih sudah selesai dilaksanakan.





251. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 018 Bintang Timur dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 135,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dimana saat ini dalam proses finishing.



252. Belanja pemeliharaan lampu jalan 4 ornament (Kec. Bintang Timur 3 buah, Kec. Bintang Utara 3 buah, Kec. Teluk Sebong 1 buah, Kec. Teluk Bintang 1 buah, Kec. Gunung Kijang 2 dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 25,000,000,-

- Bahwa kondisi lapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan.



253. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tower di Kel. Kijang Kota Kec. Bintim (1 Unit) dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 200,000,000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan.



254. Pemeliharaan Pos Jaga dan Kantor TPA di Kel. Sei Enam Kec. Bintang Timur dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 7,470,000.00,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan dilaksanakan.







255. Pemeliharaan pagar TPA di Kel. Sei Enam Kec. Bintang Timur dengan anggaran APBD murni sebesar Rp5,820,000.00,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan dilaksanakan.



256. Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan ( Ruas 4 ) Kabupaten Bintan ( tahap 1 ) ( 1 Km ) dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 14.000.000.000,-

- Pekerjaan sedang dikerjakan.





257. Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan ( Ruas 3 ) Kabupaten Bintan ( tahap 1 ) ( 1 Km ) dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 14.000.000.000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sedang dalam tahap pelaksanaan lean clearing badan jalan dan proses pengerasan.



258. Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan ( Ruas 2 ) Kabupaten Bintan ( tahap 1 ) ( 1 Km ) dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 4.000.000.000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sedang dalam tahap pelaksanaan lean clearing badan jalan dan proses pengerasan.



259. Pembangunan Jalan Lintas Barat Lanjutan ( Ruas 1 ) Kabupaten Bintan ( tahap 1 ) ( 1 Km ) dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 8.000.000.000,-

- Bahwa kondisi dilapangan saat ini kegiatan dimaksud sedang dalam tahap pelaksanaan lean clearing badan jalan dan proses pengerasan.



260. Pembangunan Paving Blok Jalan Korindo Gg. Bodri II RT. 03 RW. 02 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (714 M2) dengan anggaran APBD Perubahan murni sebesar Rp. 230,000,000.-

- Pekerjaan sedang dikerjakan.
