

HASIL MONITORING TRIWULAN IV

**KECAMATAN SERI KUALA LOBAM**

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan ini merupakan urusan wajib bidang pendidikan, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan nilai pada DPA sebesar Rp.137.503.215,00. Dari hasil pantauan dilapangan dapat kami informasikan bahwa pekerjaan rehabilitasi ruang kelas sedang dilaksanakan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Pembangunan Pagar SDN 007 Kec. Seri Kuala Lobam, Pagu dana pada DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.220.000.000,00.  
Pembangunan Pagar SDN 007 di Kec Seri Kuala Lobam merupakan urusan wajib Pendidikan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, dengan pagu dana sebesar Rp. 220.000.000,00. Saat dilakukan pemantauan pekerjaan pembangunan pagar SDN 007 Kecamatan Seri Kuala Lobam sedang dilaksanakan. Pekerjaan yang dilakkan sudah sampai tahap pengecatan dan tinggal beberapa bagian lagi pekerjaan akan selesai. Diharapkan konsultan pengawas bersama dinas Pendidikan selalu mengawasi pekerjaan ini sampai dilakukan serah terima hasil pekerjaan.



4. Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Desa Busung Kec Seri Kuala Lobam. Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.520.873.500,00.  
Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Desa Busung Kec Seri Kuala Lobam merupakan urusan wajib Lingkungan Hidup yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, dengan pagu dana sebesar Rp.520.873.500,00. Berdasarkan keterangan dari Dinas terkait dapat diketahui bahwa kegiatan ini sedang dikerjakan, Namun terdapat masalah terkait belum dicairkannya anggaran, yaitu terdapat kekeliruan dalam penulisan kode rekening belanja yang seharusnya "Belanja Hibah Barang dan Jasa tertulis Belanja Modal", sehingga rekening belanja kegiatan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu di APBD Perubahan dan sedang menunggu evaluasi Perubahan APBD di Provinsi. Diketahui ternyata pekerjaan yang sedang berlangsung menggunakan dana masyarakat terlebih dahulu. Dan terdapat tuntutan masyarakat untuk Dinas PU segera mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dinas terkait diharapkan segera menyelesaikan masalah agar kegiatan dapat selesai tepat waktu.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

5. Pembangunan SPAM Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam (Accessories pipa, pipa HDPE, pompa dan sambungan rumah murah) sebesar Rp. 275.000.000,00. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV.Mata Air dengan nilai kontrak sebesar Rp.267.882.136,06,- dengan konsultan PT Duta Consultant Engineering. Kegiatan ini merupakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan nilai pada DPA sebesar Rp.275.000.000,00. Pembangunan SPAM Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam ini termasuk Accessories pipa, pipa HDPE, pompa dan sambungan rumah murah). Menurut hasil monitoring dilapangan dapat kami informasikan bahwa pekerjaan sudah diselesaikan.



Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam. Pagu dana DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.825.000.000,00. Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam merupakan urusan wajib Lingkungan Hidup yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Menurut Informasi dilapangan kegiatan ini sedang dikerjakan, Namun terdapat masalah terkait belum dicairkannya anggaran, yaitu terdapat kekeliruan dalam penulisan kode rekening belanja yang seharusnya “Belanja Hibah Barang dan Jasa tertulis Belanja Modal”, sehingga rekening belanja kegiatan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu di APBD Perubahan dan sedang menunggu evaluasi Perubahan APBD di Provinsi. Diketahui ternyata pekerjaan yang sedang berlangsung menggunakan dana masyarakat terlebih dahulu. Dan terdapat tuntutan masyarakat untuk Dinas PU segera mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dinas terkait diharapkan segera menyelesaikan masalah agar kegiatan dapat selesai tepat waktu.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (SDN 003 Busung) Kecamatan Seri Kuala Lobam. Kec. Seri Kuala Lobam. Pagu dana DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.660.000.000,00.  
Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (SDN 003 Busung) Kecamatan Seri Kuala Lobam merupakan urusan wajib perhubungan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, dengan pagu dana sebesar Rp.660.000.000,00. Selain di SDN 003 Busung kegiatan ini juga dilaksanakan di SMUN 05 Bintan Kec Bintan Utara, SDN 011 Bintan Timur dan SDN 001/002 Bintan Utara). Dari hasil pantauan dilapangan pekerjaan tersebut belum dilaksanakan. Informasi yang didapat dari dinas perhubungan dilaporkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan



5. Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 4 Unit (SMPN 15 Busung Kec. Seri Kuala Lobam) . Pagu dana DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.200.000.000,00.  
Kegiatan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 4 Unit selain di Kec. Seri Kuala Lobam juga dilaksanakan di (Depan SDN 02/005 Bintan Timur, Depan MIN Kecamatan Teluk Sebong) merupakan urusan wajib Perhubungan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, dengan pagu dana total sebesar Rp.200.000.000,00. Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Peningkatan SPAM Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (Sambungan rumah murah, Accessories pipa, Pipa HDPE). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.220.000.000,00. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Pormula Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp.213.095.078.29,- dengan konsultan PT Duta Consultant Engineering. Peningkatan SPAM Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam belum dilaksanakan. Menurut hasil monitoring dilapangan dapat diinformasikan bahwa pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan.



7. Pembangunan Pagar (235 M). Dinding Penahan ( 42,50 M) dan saluran Drainase (167 M ) Puskesmas Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam. Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.393.000.000,00. Pembangunan Pagar (235 M). Dinding Penahan ( 42,50 M) dan saluran Drainase (167 M ) Puskesmas Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan tim monitoring dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar (235 M). Dinding Penahan ( 42,50 M) dan saluran Drainase (167 M ) sudah selesai dikerjakan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Peningkatan SPAM IKK Seri Kuala Lobam (Accessories pipa, pipa HDPE dan sambungan rumah murah) sebesar Rp. 617.100.000,00.

Kegiatan ini merupakan urusan wajib bidang pekerjaan umum, yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan nilai pada DPA sebesar Rp.617.100.000,00. Peningkatan SPAM IKK Seri Kuala Lobam ini termasuk Accessories pipa, pipa HDPE, dan sambungan rumah murah). Menurut informasi dari Dinas Pekerjaan Umum, dapat kami informasikan bahwa pekerjaan masih dalam proses lelang sehingga pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dilaksanakan.



9. Pembangunan Drainase dan Duiker Perumahan Lobam Mas Asri Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (600 M). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.650.000.000,00.

Pembangunan Drainase dan Duiker Perumahan Lobam Mas Asri Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (600 M) Kec. Seri Kuala Lobam merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Pembangunan Drainase Jl. Merak - Jl. Garuda Perumnas Bumi Tanjung Permai Kel Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam. Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.200.000.000,00. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV AQJ Gemilang, dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.386.000,- dengan konsultan CV Muklti Deseko. Pembangunan Paving Block Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam. Merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan, Berdasarkan hasil pantauan dilapangan pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Merak - Jl. Garuda Perumnas Bumi Tanjung Permai Kel Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam telah selesai dilaksanakan.



11. Pembangunan Box Culvert Jalan Merak - Jalan Garuda Perumnas Bumi Tanjung Permai Kelurahan Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (8 M x 1 M ) (2 Buah). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.300.000.000,00. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Ghiri Artha Kencana, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 272.564.804,32,-, dengan konsultan PT Global Wahana Cipta. Pembangunan Box Culvert Jalan Merak - Jalan Garuda Perumnas Bumi Tanjung Permai Kelurahan Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (8 M x 1 M ) merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan, Berdasarkan hasil pantauan dilapangan pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan Merak - Jalan Garuda Perumnas Bumi Tanjung Permai Kelurahan Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (8 M x 1 M ) sudah selesai dilaksanakan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

12. Perbaikan drainase Gg. Merpati Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam (600 M). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.300.000.000,00.

Perbaikan drainase Gg. Merpati Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam (600 M) merupakan urusan wajib Pekerjaan umum yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bintan. Dari hasil pantauan tim monitoring tampak pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.



13. Penataan dan pembangunan TPU RT 03 RW VII Kelurahan Teluk Lobam Seri Kuala Lobam (TPU Taman Firdaus). Pagu dana DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.200,000,000,00.

Penataan dan pembangunan TPU RT 03 RW VII Kelurahan Teluk Lobam Seri Kuala Lobam (TPU Taman Firdaus) merupakan urusan wajib Lingkungan Hidup yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan.





HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN TELUK SEBONG

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Teluk Sebong serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan drainase dan gorong-gorong RT.04/RW.01 Dusun I Desa Sebong Perekh Kec. Teluk Sebong 1 Km. Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan dan telah selesai dikerjakan. Indikasi TA.2015 Rp. 500.000.000,-.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Pembangunan saluran drainase lingkungan. Pembangunan drainase Perum Garden View Kec. Teluk Sebong ( 400 m ).Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Bintang Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.843.700,-.dengan konsultan PT Duta Konsultan. Dari hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini sudah selesai dilaksanakan.



3. Pembangunan RKB SDIT Harmoni Bintang Desa Sebong Perih Kec. Teluk Sebong (1 RKB, 7 x 8 M). Dari hasil monitoring dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan pembangunan sudah selesai dikerjakan.Indikasi TA.2015 sebesar 200.000.000,-.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 007 Kota Baru Kec. Teluk Sebong. Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan/dilaksanakan. Pekerjaan harus dipercepat mengingat sudah memasuki akhir tahun anggaran. Indikasi TA.2015 Rp. 293.068.800,-



5. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 002 Kec. Teluk Sebong. Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan/dilaksanakan, Pekerjaan harus dipercepat mengingat sudah memasuki akhir tahun anggaran. Indikasi TA.2015 Rp. 293.068.800,-



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SDN 006 Sekuning Kec. Teluk Sebong. Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan/dilaksanakan. Pekerjaan masih dalam tahap pembongkaran atap lama. Disampaikan kepada pelaksana pekerjaan bahwa pekerjaan harus dipercepat mengingat sudah memasuki akhir tahun anggaran. Indikasi TA.2015 Rp. 91.668.810,-.



7. Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SDN 004 Ekang Kec. Teluk Sebong. Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan telah selesai dikerjakan. Diharapkan pelaksana pekerjaan segera membersihkan lokasi pekerjaan dari sisa bahan-bahan bangunan. Indikasi TA.2015 Rp. 137.503.215,-.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar SDN 008 Sri Bintang Kec. Teluk Sebong. Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan sudah akan selesai dilaksanakan. Indikasi TA.2015 Rp. 137.503.215,-.



9. Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) SMIT Al Madinah Boarding School Senggiling Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong (Lanjutan). Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan sedang dilaksanakan, berjalan/dilaksanakan, (lanjutan). Indikasi TA.2015 Rp. 480.500.000,-.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Pembangunan SPAM Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong (Browncaptering, sambungan rumah murah, accessories pipa dan pipa HDPE). Dari pantauan Tim Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Namun yang menjadi catatan adalah lokasi sumber air yang sulit dijangkau dan kebersihan lokasi sumber air. Jika Air tersebut hendak digunakan oleh warga, hendaknya lokasi sumber air harus bersih. Indikasi TA.2015 Rp. 440.000.000,-.



11. Peningkatan infrastruktur pengolahan air limbah Desa Berakit Kec. Teluk Sebong. Dari pantauan Tim pelaksanaan pekerjaan belum berjalan/dilaksanakan. Indikasi TA.2015 Rp. 141.449.000,-.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

12. Pengadaan dan Pemasangan Delianator (180 bh) 2 Kecamatan (kec. Gunung kijing, Kec. Teluk Sebong). Dari monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lokasi Kecamatan Teluk Sebong telah selesai dilaksanakan.



13. Belanja modal pengadaan dan pemasangan warning light depan MIN Jln. Bathin M. Ali Berakit Kecamatan Teluk Sebong. Dari monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lokasi Kecamatan Teluk Sebong telah selesai dilaksanakan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

14. Pembangunan Dermaga Semelur Tahap II (242 M x 3 M) + (T4 x 10M) + Ruang tunggu Pagu Dana Rp.3.865.165.000,- dengan pelaksana pekerjaan PT. Bintang Seroja, konsultan pengawas PT. Bentan Sondong dan konsultan perencanaan CV. Graha Adiguna Konsultan. Dari hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan sedang dilaksanakan. Diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.





HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN TOAPAYA

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Toapaya serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 002 Kec. Toapaya 1 RKB dengan pagu sebesar Rp. 293.068.800.-.

Kegiatan ini merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Kegiatan ini merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Pada saat dilakukan monitoring tahap IV dapat dilaporkan bahwa pekerjaan sedang dilaksanakan. Disampaikan kepada SKPD terkait untuk terus mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Pembangunan Paving blok SMPN 17 (656 M) Kec. Toapaya. Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan pengerjaannya dengan realisasi anggaran APBD Murni sebesar Rp. 164. 000.000,- .Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Yaris Estina sukses dengan nilai kontrak sebesar Rp.163.385.300 dengan konsultan CV Tunjuk Satu Konsultan.



3. Pembangunan ruang kelas baru SDN 001 Toapaya. kegiatan ini belum ada pengerjaan di lapangan, dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 293.068.800.Pekerjaan sedang dilaksanakan. Disampaikan kepada SKPD terkait untuk terus mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Rehabilitasi ruang kelas SDN 001 Toapaya. kegiatan ini belum ada pengerjaan di lapangan, dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. -. Disampaikan kepada SKPD terkait untuk terus mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.



5. Pembangunan ruang majelis guru SDN 001 Toapaya. Kegiatan ini sedang dilaksanakan, dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 402.969.600.-. Disampaikan kepada SKPD terkait untuk terus mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Pembangunan paving blok SD 005 Cikolek Desa Toapaya (620 M<sup>2</sup>). Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan, dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 155.000.000;



7. Pembangunan paving blok SD 006 Lome Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (575 M<sup>2</sup>). Kegiatan ini sudah selesai pengerjaannya dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 143.750.000.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Rehabilitasi ruang kelas SD 006 Lome Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (3 lokal). Kegiatan ini sedang dilaksanakan, realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 137.503.215. Disampaikan kepada SKPD terkait untuk terus mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.



9. Pangunan pembukaan akses jalan karet RT. 04/ RW. 02 Kp. Bukit Sinjang Desa Toapaya Kec. Toapaya (700 M). Kegiatan ini sedang dalam tahap penyelesaian pengerjaan ± 50 M, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Pembangunan / peningkatan jalan Cikolek-Kawal Kec. Toapaya-Gunung Kijang (2,6 KM), sudah selesai dikerjakan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.332.846.000; Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Dwitama Portuna Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.331.750.994,- dengan konsultan PT Wadah Cipta Teknik.



11. Pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi tenaga listrik di Gg. Kelinci Kp. Melayu Desa Toapaya Kec. Toapaya (300 M). Kegiatan ini sudah terlihat selesai pemasangan jaringan listrik hanya pendistribusian listrik ke rumah penduduk yang belum ada, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

12. Pembangunan paving blok Kp. Sumber Karya RT 15 RW V Kel. Toapaya Asri (660 M2), kegiatan pada TAHAP III ini sudah selesai dilaksanakan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 165.000.000,-i



13. Pembangunan halte angkutan umum di SDN 004, SMAN 2 dan Pasar Tani . untuk SDN 004 dan Pasar Tani sudah selesai dikerjakan, sementara untuk SMAN 2 baru terpasang lantai dasar halte angkutan umum.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

14. Pembangunan ruang kelas baru di SDN 004 Kec. Toapaya. Pekerjaan sedang dilaksanakan.



15. Pembangunan Drainase KM. 15 Kec. Toapaya (500 M). Kegiatan ini sudah selesai dikerjakan, dengan anggaran APBD murni sebesar Rp. 250.000.000,-.





# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

16. Belanja pemeliharaan lampu jalan 4 ornamen Kec. Toapaya.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN TAMBELAN

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Tambelan serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala (Rehabilitasi) Jalan Raya Tambelan Kec.Tambelan (1,3 Km) dengan realisasi sebesar Rp. 3.341.900.000 Kegiatan pemeliharaan berkala (rehabilitasi) jalan raya tambelan sedang dilaksanakan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

3. Pembangunan Jalan Buras Beton Bertulang Jalan Lingkar Tambelan (1.786 M<sup>2</sup>) dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000.000 Kegiatan pembangunan jalan buras beton bertulang jalan lingkar tambelan sudah selesai dilaksanakan.



4. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 005 Desa Kp. Hilir Kec. Tambelan (3 RKB) dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000 Kegiatan Rehabilitasi ruang kelas SDN 015 di tambelan sudah selesai dilaksanakan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

5. Pembangunan lapangan futsal di Kec. Tambelan dengan realisasi sebesar Rp. 2.300.000.000 Kegiatan Pembangunan lapangan futsal di tambelan sudah selesai dilaksanakan.



6. Pembangunan Asrama Pelajar (Rumah Adat) Tambelan di Tanjungpinang (1 Gedung) Tahap I dengan realisasi sebesar Rp. 895.000.000 Kegiatan Pembangunan Asrama pelajar (Rumah Adat) di tambelan sedang dilaksanakan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Alya Berkah Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp.831.707.891,95,- dengan konsultan CV Dikentama Engineering Konsultan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Pemeliharaan Pelabuhan Sri Bentayan Kec. Tambelan dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000 pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pelabuhan sudah terlaksana di kecamatan tambelan



9. Pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell beserta tiangnya di Pelantar RT 03, RT 04, RW 02 Desa Batu Lepuk Kec. Tambelan ( 8 Unit ) dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell di tambelan sudah selesai dilaksanakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Pengadaan dan pemasangan lampu jalan di Kecamatan Tambelan ( 27 Unit ) dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di tambelan sudah selesai dilaksanakan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN BINTAN PESISIR

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan pelantar permukiman Desa Air Gelubi Kecamatan Bintan Pesisir (85 m x 1,5 m). Sampai dengan tim turun kelokasi lapangan pekerjaan kegiatan telah selesai dilaksanakan, pelantar pemukiman sudah bisa digunakan sebagai tempat berlabuh kegiatan masyarakat Air Gelubi Kecamatan Bintan Pesisir. Indikasi TA.2015 Rp. 371.110.000,-.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

### 2. Pembangunan Gedung Kantor.

-Pembangunan gedung kantor Desa Kelong (48 M2) dan sarana pendukung di Kecamatan Bintan Pesisir.

-Nilai Kontrak Rp. 632.439.149,17,-

Pelaksana dari pekerjaan ini adalah CV. Pilar Buana Bintan yang di Konsultani oleh CV. Yudha Karya dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Kegiatan ini sudah selesai dikerjakan.



### 3. Pembangunan Masjid Raya Al-Ma'ruf Desa Kelong Kecamatan Bintan. Sampai dengan tim turun kelokasi dari pekerjaan pembangunan Masjid Raya Al-Ma'ruf Desa Kelong disampaikan bahwa pekerjaan dilapangan baru sampai dengan pembongkaran bagian depan dari masjid, menurut informasi warga dalam beberapa hari kedepan pelaksanaan pekerjaan sudah akan dimulai. Indikasi TA.2015 Rp. 2.500.000.000,-.





# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Belanja bahan material MCK Tahap I Kecamatan Bintan Pesisir. Rp. 289.000.000,-. Sampai dengan Tim turun ke lapangan pelaksanaan pekerjaan sedang dilaksanakan dan berjalan, fisik yang dikerjakan berupa tempat untuk MCK baru 1 unit terbangun dari 5 unit yang direncanakan, tapi untuk bahan material sebagai bahan pembangunan MCK sudah disiapkan.



5. Pembangunan Pos Kamling (APBN). Pekerjaan telah diselesaikan



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Rehab Masjid dan Pembangunan Pagar(APBN). Pada saat monitoring dilaksanakan.Pekerjaan sedang dikerjakan.dalam tahap finishing pekerjaan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN MANTANG

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik di SDN 001, SDN 002, SDN 003, SMPN 23, SMA Negeri di Kecamatan Mantang dengan Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Dari hasil monitoring diatas diperoleh saran/tindak lanjut sebagai berikut :  
-Agar pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik dan Penyambungan Daya Listrik di SDN 001, SDN 002, SDN 003, SMPN 23, SMA Negeri di Kecamatan Mantang ini dapat diselesaikan mengingat masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum nampak diselesaikan. Untuk itu PPTK kegiatan dapat memantau dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan ini.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor dan Majelis Guru SDN 002 Mantang dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 127.919.770.-. Pembangunan RKB ini sudah tepat sasaran melihat kondisi fisik bangunan yang sudah tidak layak untuk digunakan dan saat ini Ruang Kantor dan Majelis Guru masih bergabung menggunakan ruang kelas. Demikian pula dengan lantai bangunan ruangan kelas yang sudah banyak berlubang. Lantai menggunakan paving blok. Pada saat dilakukan monitoring Triwulan II, pembangunan belum dilaksanakan. Setelah dikonfirmasi ke PPK kegiatan di Dinas Dikpora Kabupaten Bintan diperoleh informasi bahwa, progresnya masih dalam tahap pembuatan gambar (DED). Disamping itu adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan anggaran dari pusat (karena menggunakan dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)). Mengingat kondisi fisik bangunan yang memerlukan rehabilitasi segera, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dipercepat.



3. Pembangunan Rumah Dinas SDN 002 Mantang dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 184.896.000.-. Pembangunan ini sudah tepat sasaran melihat kondisi fisik bangunan rumah dinas yang sudah tidak layak huni. Pada saat dilakukan monitoring Triwulan II, pembangunan belum dilaksanakan. Setelah dikonfirmasi ke PPK kegiatan di Dinas Dikpora diperoleh informasi bahwa, progresnya masih dalam tahap pembuatan gambar (DED). Disamping itu adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan anggaran dari pusat (karena menggunakan dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)). Mengingat kondisi fisik bangunan yang memerlukan rehabilitasi segera, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dipercepat.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN 002 Mantang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 137.503.215.-. Pembangunan RKB ini sudah tepat sasaran melihat kondisi fisik bangunan ruang kelas yang ada. sudah tidak layak untuk proses belajar mengajar. Kondisi ini diperparah pula dengan lantai bangunan ruangan kelas sudah banyak berlubang tentunya akan membahayakan murid-murid maupun guru. Lantai Ruang Kelas yang ada saat ini menggunakan paving blok. Pada saat dilakukan monitoring Triwulan II, pembangunan belum dilaksanakan. Setelah dikonfirmasi ke PPK kegiatan di Dinas Dikpora diperoleh informasi bahwa, progresnya masih dalam tahap pembuatan gambar (DED). Disamping itu adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan anggaran dari pusat (karena menggunakan dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)). Mengingat kondisi fisik bangunan ruang kelas belajar yang memerlukan rehabilitasi segera, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dipercepat.



5. Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Bintang SDN 003 Mantang dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 91.668.810.-. Pembangunan RKB ini sudah tepat sasaran melihat kondisi fisik bangunan ruang kelas yang ada sudah tidak layak untuk proses belajar mengajar. Dari hasil monitoring dapat dilihat langit-langit Ruang Kelas sudah lapuk dan mulai hancur. Hal ini akan membahayakan murid-murid yang sedang mengikuti proses belajar mengajar. Dilain pihak lantai bangunan ruangan kelas juga sudah banyak yang berlubang. Pada saat dilakukan monitoring Triwulan II, pembangunan belum dilaksanakan. Setelah dikonfirmasi ke PPK kegiatan di Dinas Dikpora diperoleh informasi bahwa, progresnya masih dalam tahap pembuatan gambar (DED). Disamping itu adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan anggaran dari pusat (karena menggunakan dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)). Mengingat kondisi fisik bangunan ruang kelas belajar yang memerlukan rehabilitasi segera, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dipercepat.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Pembangunan Taman di Mantang Kecamatan Mantang dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 100.000.000.-. Berdasarkan hasil monitoring dan identifikasi di lapangan pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan sesuai dengan target waktu dan menurut informasi pelaksana pekerjaan akan segera diserahkan terimakasih.



7. Pembangunan USB SMAN 8 Bintan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang (RKB, Majelis Guru, Aula, KM/ WC) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 1.500.000.000.-



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Pengadaan pemasangan jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Kampung Mantang Riau dan di Kampung Mantang Lama Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang (1 Kegiatan), dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 90.000.000.-. Pelaksanaan kegiatan ini telah dimonitor dan identifikasi, sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan kegiatan belum dilaksanakan menurut informasi PPTK masih dalam proses persiapan administrasi. Saran dan tindak lanjut agar segera mempercepat penyelesaian paket pekerjaan ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, mengingat pentingnya kebutuhan listrik khususnya untuk penerangan.



9. Rehabilitasi Ruang Kelas SD 004 Kelas Jauh RT 05/ RW 03 Telang Besar Desa Mantang Besar Kecamatan Mangtang (1 Paket) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 170.000.000,- anggaran APBD murni sebesar Rp. 170.000.000,- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan ini telah memasuki tahapan penyelesaian akhir. Pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai target. Namun ada pekerjaan yang sebetulnya perlu dikerjakan namun tidak dilaksanakan yaitu WC. Untuk itu BAPPEDA akan meminta keterangan dari PPTK/SKPD pelaksana.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Rehab Polindes Mantang Besar Kecamatan Mantang dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 150.000.000.- Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan kegiatan ini sudah tepat sasaran. Mengingat kondisi bangunan yang sudah memerlukan rehabilitasi fisik segera. Pada saat dilaksanakan monitoring pekerjaan belum dilaksanakan. Menurut PPTK kegiatan ini masih dalam proses administrasi.



11. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Telang Besar Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang (1 Kegiatan) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 60.000.000.- Kegiatan ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bintan dalam upaya memenuhi rasio eliktrifikasi. Berdasarkan identifikasi dilapangan kebutuhan pembangkit listrik tenaga surya di pulau Telang Besar, Desa Mantang sudah tepat sasaran mengingat kondisi geografis Pulau Telang Besar yang terisolir namun didiami beberapa Kepala Keluarga. Masyarakat membutuhkan listrik khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan penerangan. Pada saat dilakukan monitoring kegiatan ini masih belum dilaksanakan.





# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

11. Pembangunan Pelantar Permukiman Pulau Telang Kecil Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang (150 M X 1,5 M), dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 527.900.500.- saat dilakukan monitoring dilapangan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai target yang direncanakan. Menurut pelaksana pekerjaan dilapangan, tidak ada kendala yang berarti selama pelaksanaan pekerjaan, Sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Dan pekerjaan akan segera diserahkan terimakan ke Pemerintah Kabupaten Bintan.



12. Pembangunan Paving Blok Halaman SD 002 Desa Dendun Kecamatan Mantang (408 M2) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 111.350.000.-

Pembangunan Paving Blok Halaman SDN 002 Desa Dendun sudah tepat sasaran. Karena memperhatikan kondisi lapangan halaman SDN 002, Desa Dendun yang tidak rata, cenderung berdebu bila musim panas. Sedangkan bila cuaca hujan cenderung becek. Penggunaan paving blok dikarenakan beberapa kelebihan :

- Paving blok mempunyai daya serap air yang baik sehingga dapat mengurangi genangan air dan mencegah bahaya banjir.
- Pemasangan paving blok sangat mudah, tidak mempergunakan spesi pasangan, pengikat antara masing-masing paving blok cukup menggunakan pasir sebagai bahan pengisi.
- Apabila terjadi kerusakan (pecah) dapat diganti dengan mudah, cukup dengan mengambil paving yang pecah dan diganti dengan yang baru.

Saat dilakukan monitoring kegiatan telah selesai dikerjakan. Sesuai dengan hasil monitoring, kegiatan ini telah selesai dikerjakan, dan akan memasuki tahapan serah terima pekerjaan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

13. Rehabilitasi Dermaga RT 04 / RW 03 Telang Kecil Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang (UK.25M X 2 M) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 200.000.000.- Sesuai dengan hasil identifikasi lapangan pelaksanaan paket pekerjaan ini telah selesai dikerjakan dan akan memasuki tahap serah terima hasil pekerjaan. Dermaga ini sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana tempat menambat/merapat kapal-kapal nelayan. Selain itu juga untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal dan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum. Saat ini dermaga sudah dipakai oleh masyarakat.



14. Peningkatan SPAM Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang (Accessories pipa, pipa HDPE, menara air, pompa dan sambungan rumah murah) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 338.613.000.- Pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa pembangunan menara air, pemasangan pompa serta penyambungan/pemasangan pipa HDPE serta asesoris pipa kerumah-rumah. Pekerjaan ini merupakan peningkatan dari SPAM yang sudah ada. Namun belum dapat melayani permintaan air bersih yang terus meningkat. Diharapkan dengan peningkatan SPAM ini, masalah air bersih dapat diatasi khususnya di Kecamatan Mantang. Saat dilakukan monitoring pekerjaan belum dilaksanakan. Setelah dapat konfirmasi PPTK diketahui bahwa sedang dalam tahap persiapan administrasi lelang. Adapun saran dan tindak lanjut untuk pekerjaan ini segera dilakukan percepatan pelaksanaan agar target dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

- 15 Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Kampung Pasir Merah dan Kampung Lakis Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang (1 Kegiatan) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 150.000.000.- Pada saat dilakukan monitoring pekerjaan belum dilaksanakan. Menurut informasi dari PPTK pekerjaan dalam tahap persiapan administrasi pelelangan. Adapun saran dan tindak lanjut untuk pekerjaan ini segera dilakukan percepatan pelaksanaan agar target dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.



- 16 Pembangunan pagar SD 002 Desa Dendun Kecamatan Mantang (P = 100 M X T = 1,5 M) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 153.000.000.- Pada saat dilakukan monitoring pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pagar SDN 002 Desa Dendun Kecamatan Mantang telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan target.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

17. Peningkatan SPAM Perdesaan (RO) Desa Dendun Kecamatan Mantang (Bangunan Intake dan Mekanikal Elaktrikal) dengan realisasi anggaran APBD murni sebesar Rp. 180.000.000.- Pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa pembuatan bangunan intake yaitu suatu bangunan yang berfungsi sebagai penyadap atau penangkap air baku yang berasal dari sumbernya atau badan air seperti sungai, danau atau kolam sesuai dengan debit yang di perlukan untuk pengolahan. Bangunan intake harus disesuaikan menurut konstruksi bangunan air, dan pada umumnya memiliki konstuksi beton bertulang (reinforced concrete) agar memiliki ketahanan yang baik. Pada saat dilaksanakan kegiatan monitoring Triwulan II ini pekerjaan masih belum dimulai. Menurut informasi dari PPTK masih dalam proses administrasi. Tim menyarankan agar kegiatan segera dilaksanakan mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih khususnya di Pulau Dendun.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN BINTAN UTARA

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Bintan Utara serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pembangunan Box Culvert Jalan Permaisuri RT. 01 RW. 03 Tanjung Uban. Kec. Bintan Utara, Pagu Anggaran Pakert Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.300.000.000.

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV ORIKONS dengan nilai kontrak sebesar Rp.283.283.284,-. Dengan konsutan CV GLOBAL WAHANA CIPTA. Box culvert tersebut berfungsi untuk mengalirkan air yang ada di jalan Permaisuri karena box culvert sebelumnya tidak lagi berfungsi sebagaimana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan volume sebesar (10M x 1M) 1 Buah. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Pembangunan Pembangunan Box Culvert Kp. Melati luar RT.01 RW.03 Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, Pagu Anggaran Pakert Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Box culvert tersebut berfungsi untuk menggantikan Box culvert ada saat ini karena sudah rusak serta mengurangi genangan air apabila terjadi hujan dan air pasang surut karena kondisi tempat tersebut merupakan rawa-rawa. Lokasi tersebut terletak di Kp. Melati Tanjung Uban. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dengan volume sebesar (8M x 2M) 1 Buah. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV. Adi Putra Perkasa. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



3. Pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur Tanjung Uban Kec. Bintan Utara, Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.2.000.000.000. Berdasarkan informasi yang diperoleh pembangunan tersebut meliputi pembangunan profil mesjid, pagar, pot bunga dan parit masjid yang saat ini dalam pengerjaan. Untuk pengerjaan profil Mesjid dan Drainase sudah selesai dilaksanakan, sedangkan pagar tinggal pemasangan teralis dan pot bunga/ tempat bunga tinggal pengecatan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 006 Bintan Utara (2 kelas). SDN 006 memiliki 8 ruangan kelas dengan 12 Rombongan Belajar sehingga ada beberapa kelas yang masuk siang. Kondisi ruangan kelas sudah mulai rusak seperti Plavond terkena air, atap yang sudah berkarat dan cat yang sudah mengelupas sehingga sangat diperlukan rehabilitasi ruangan agar menciptakan kenyamanan dan keamanan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Anggaran kegiatan ini bersumber dari DAK sebesar Rp.91.668.810. Paket pekerjaan ini baru tahap dasar rehabilitasi bangunan.



5. Pembangunan ruang kelas baru SDN 007 Bintan Utara (2 Unit), Anggaran pembangunan bersumber dari DAK sebesar Rp. 293.068.800, Paket pekerjaan ini masih dalam proses pembangunan fisik dasar bangunan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Pembangunan ruang kelas baru SDN 003 Bintan Utara (2 Unit). SDN 003 memiliki 8 ruangan kelas dengan 14 Rombongan Belajar sehingga masih terdapat kekurangan ruangan dalam proses belajar mengajar. Sangat dibutuhkan pembangunan RKSB untuk menambah jumlah ruangan. Anggaran pembangunan bersumber dari DAK sebesar Rp. 293.068.800. Paket pekerjaan ini masih dalam proses pembangunan fisik dasar bangunan.



7. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 009 Bintan Utara (2 Unit). Anggaran pembangunan bersumber dari DAK sebesar Rp. 293.068.800. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah bahwa RKSB akan dibangun di lapangan untuk olah raga para siswa. Paket pekerjaan ini masih dalam proses pembangunan fisik dasar bangunan.





## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Bintan Utara (4 kelas). Kondisi ruangan kelas sudah mulai rusak seperti Plavond terkena air, atap yang sudah berkarat dan cat yang sudah mengelupas sehingga sangat diperlukan rehabilitasi ruangan agar menciptakan kenyamanan dan keamanan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Anggaran pembangunan bersumber dari DAK sebesar Rp. 183.337.620. Paket pekerjaan ini belum terlihat dilapangan setelah dikonfirmasi dari kepala sekolah selaku pelaksana pembangunan bahwa pekerjaan akan segera dilaksanakan tanggal 4 november. Adapun kendala dilapangan disebabkan oleh baru diterimanya gambar/DED bangunan yang akan direhab.



9. Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 03/RW. 03 Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara (500 M), Pagu Anggaran Pakert Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Drainase tersebut berfungsi untuk mengalirkan air di perumahan warga dari jalan yos sudarso ke parit besar terminal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Rehab Ringan Puskesmas Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara (360 M<sup>2</sup>). Rehab ini dilakukan untuk memperbesar ruangan UGD yang akan disatukan dengan ruang rawat inap untuk menampung pasien. Rehab ini juga untuk memindahkan posisi pintu pada ruangan obat dan laboratorium serta pemasangan keramik. Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien di Puskesmas Tanjung Uban. Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp. 200.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian



11. Pembangunan Drainase dari Perum. Telaga Suriya Ke RT. 01, 02 RW. 03 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara ( 500 M), Pagu Anggaran Pakert Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

12. Pembangunan Paving Blok Gg Bima I Kp Baru Kel Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara (430 M<sup>2</sup>), Pagu Anggaran Pakert Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.107.500.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



13. Pembangunan Paving Blok Gg Antasena Kp Baru Kel Tanjung Uban Utara Kec Bintan Utara (365 M<sup>2</sup>), Pagu Anggaran Pakert Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.91.500.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

14. Pembangunan Box Culvert Jalan Jend. Sudirman RT. 02 RW. 04 (Depan Gereja Pantekosta) Tanjung Uban Kec. Bintang Utara (7 M x 1 M) (1 buah), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.300.000.000. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Alam Makmur Sentosa dengan nilai kontran sebesar Rp. 279.014.094,04,- dengan konsultan CV PT Global Wahana Cipta. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



15. 16. Pembangunan Box Culvert RW III Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara (10 M x 2 M) (1 buah), Pagu Anggaran Pakert Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Box culvert tersebut berfungsi untuk menggantikan Box culvert yang ada saat ini karena sudah rusak dan sempit serta mengurangi genangan air apabila terjadi hujan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

16. Normalisasi Saluran Drainase Jalan Simpang Gas Elpiji Pertamina Ke Pasar Baru Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (800 M), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.600.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



17. Peningkatan SPAM Perumahan Indun Suri Raya Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara (Pipa HDPE, sumur dangkal, sambungan rumah murah dan accessories pipa), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.275.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

18. Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Jalan Tamansari Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (depan SMPN 13 s/d Jago RT.07 RW.02) (1.034 M), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.575.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



19. Pembangunan Drainase Jl. Taman Sari RT. 002, RT.03 RW.001 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara (500 M), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Pengerjaan dimulai dari tanggal 4 Agustus 2015 dengan pelaksana cv pormula jaya. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

20. Pembangunan Drainase Jalan Berdikari RT. 01, RT 04 RW.01 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara ( 500 M), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Sebagai pelaksana pekerjaan yaitu CV. Pormula Jaya. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



21. Pembangunan Drainase Jl. Mekarsari dan Bumi Moro Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara RT. 04, 02 RW.01 (500 M), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Pelaksana pekerjaan ini adalah CV. Larasmedia Graha. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

22. Pembangunan Halte Angkutan Umum di Kabupaten Bintan (lokasi : SDN 009 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara ,SDN 001 Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.40.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



23. Pembangunan Drainase Lingkungan dan Saluran Primer Desa Lancang Kuning Kec. Bintan Utara (600 M), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.700.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Sebagai pelaksana pekerjaan CV. Nuansa Bintan. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.






## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

24. Pengadaan dan Pemasangan Pita Penggaduh (300 M2) 6 Kecamatan (Kec. Bintan timur, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Utara) dengan anggaran sebesar Rp195.500.000,. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Perhubungan Kabupaten Bintan. Agar PPTK kegiatan tetap mengawasi, memeriksa dan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk rambu jalan dan delineator sesuai dengan standar perhubungan serta pemasangannya. Paket pekerjaan dalam tahap penyelesaian.



25. Pembangunan PJU Kec. Bintan Utara (48 Titik). Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.292.000.000,- Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah DKPP Kabupaten Bintan. Berdasarkan pengamatan dilapangan pemasangan lampu jalan belum dilakukan karena kegiatan tersebut masuk daftar kegiatan yang ditunda pengerjaannya.

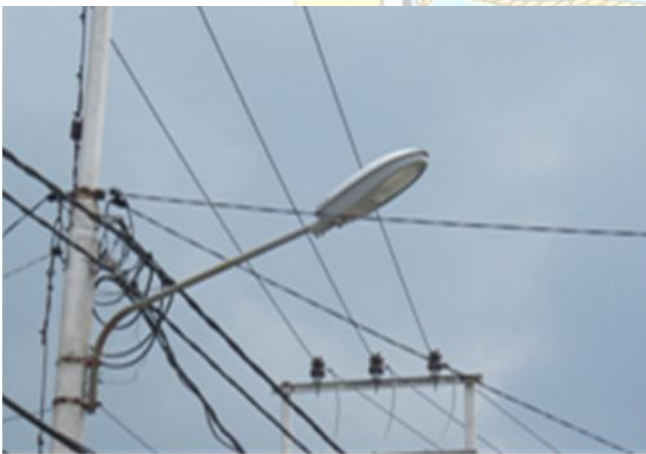

## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

26. Rehabilitasi Gedung Nasional Tanjung Uban Kec. Bintang Utara, Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.2.000.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Paket pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan.



27. Pembangunan Drainase Perum Garden View Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara (400 M), Pagu Anggaran Paket Pekerjaan (DPA) sebesar Rp.250.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Pekerjaan sedang dilaksanakan



HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Gunung Kijang serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Cikolek-Kawal Kecamatan Toapaya - Gunung Kijang (2,6KM) Rp.7.519.846.000,- Sudah terlaksana dan dalam lanjutan pekerjaan pengaspalan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 008 Gunung Kijang, Rp.45.834.420,- Belum dikerjakan dikarenakan belum adanya pencairan dana Rehabilitasi Ruang Kelas. Rehabilitasi ini diharapkan segera dilaksanakan dengan rencana peruntukan sebagai ruang majelis guru, dikarenakan SDN 008 ini belum memiliki Ruang Majelis Guru.



3. Pembangunan Jamban SDN 001 Gunung Kijang, Rp.259.200.000,- Dalam proses pekerjaan pendirian dinding jamban. 4 buah jamban ini diharapkan segera selesai karena ketersediaan fasilitas limbah yang cukup minim.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Pembangunan /Pengaspalan Jalan Kp. Melayu, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang (1 Km x 4 m), Rp.2.789.028.000,- dalam tahap penyelesaian pekerjaan.



5. Pembangunan / Pengaspalan Jalan Kp. Sungai Angus, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Rp.2.424.670.000,- sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

7. Pembangunan Jalan Masuk (Buras Beton Bertulang 176 m<sup>2</sup>) dan Paving Halaman (400 m<sup>2</sup>) SMK 3 Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Rp.173.000.000,- Pekerjaan telah selesai 100%.



8. Pembangunan Sarana Air Bersih SMK 3, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang (Perpipaan, Bak Penampungan, Pompa) Rp.106.000.000,- Proses pekerjaan pembangunan telah selesai 100%.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

9. Pembangunan Halte Angkutan Umum di Kabupaten Bintan (lokasi : SDN 001 Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang).  
Masih dalam tahap persiapan.



10. Pembangunan Taman Di Pulau Pucung, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Rp.100.000.000,- Pekerjaan telah 100% Selesai.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

11. Pembangunan Kursi Taman di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Rp.75.000.000,- Pekerjaan Telah Selesai dengan komposisi kursi telah terbangun 100%.




12. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di Jl. Pinang Indah RT 4 RW 2, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang (300 m), Rp.60.000.000,- Kegiatan ini belum dilaksanakan.





## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

13. Pembangunan Jalan Samping Masjid Besar Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang (600 m), Rp.2.320.790.000,- Kegiatan ini sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan drainase dan pengerasan jalan tahap lanjut.

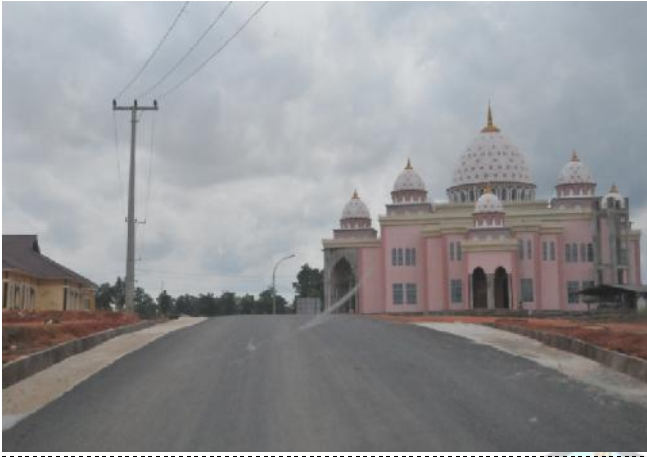

14. Pembangunan Paving Blok Kp. Karang Rejo RT 03 RW V Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang (660 m<sup>2</sup>), Rp.165.000.000,- Telah terlaksana dan selesai dikerjakan 100%



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

15. Normalisasi Saluran Kp. Sidoarjo, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang (750 m), Rp.573.000.000,- Pekerjaan ini berada pada tahap pembangunan batu miring parit sebagai drainase utama di Kp.Sidoarjo Kelurahan Kawal.



16. Pembangunan Drainase Km 23 Jalan Gesek-Kawal, Kecamatan Gunung Kijang (550 m), Rp.275.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

17. Pembangunan Drainase Jl.Manunggal RT 01 RW V, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang (400 m), Rp.200.000.000,- Masih dalam pengerjaan pembangunan batu miring drainase.



18. Pembangunan Drainase RT 03 RW 02, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang (500 m), Rp.250.000.000,- Sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

19. Pembangunan Masjid Raya An-Nur, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Rp.1.000.000.000,- Pembangunan fisik Masjid bagian eksterior sudah selesai. pekerjaan sedang melanjutkan pembangunan interior mesjid.



20. Rehabilitasi Masjid Fajrul Fallah RT 02 RW 04, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Rp.200.000.000,- Masih dalam tahap pengerjaan fisik Masjid (atap/langit-langit, jendela dan dinding).



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

21. Pembangunan Pagar Pemakaman Banjar, Kp.Sidoarjo, RT 02 RW II, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang (Lanjutan), Rp.200.000.000,- Telah selesai dikerjakan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN BINTAN TIMUR

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Bintan Timur serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi SDN 02 Bintan Timur Kec. Bintan Timur (1 Paket) Rp.170.000.000,-sudah terlaksana dan dalam pekerjaan pemasangan keramik.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Pembangunan Masjid Raya Nurul Iman Kijang Kec. Bintan Timur Rp. 5.000.000.000,- kegiatan ini telah selesai dikerjakan.



3. Pemeliharaan Pos Pelabuhan Berek Motor Kec. Bintan Timur Rp. 5.625.000,- terlaksananya pemeliharaan dan dalam proses pekerjaan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (26.500 M') Lokasi Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan dan Marka Parkir Kawasan Bebas Kendaraan (3000M') di Kecamatan Bintan Timur Rp. 805.500.000,-sudah terlaksananya pemasangan marka parkir kawasan bebas kendaraan oleh dinas perhubungan.



5. Pengadaan dan Pemasangan Pita Pengaduh (300 M2) 6 Kecamatan (Kec. Bintan timur, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Utara) Rp. 195.000.000.-sudah terlaksananya pemasangan pita pengaduh oleh dinas perhubungan.





# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Pembangunan Pagar SDN 018 Bintang Timur Rp. 140.000.000,- kegiatan ini belum terlaksana.



7. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 012 Bintang Timur Rp. 183.337.620,- kegiatan sedang dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN Bintang SDN 012 Bintang Timur Rp. 402.969.600,- sedang dikerjakan.



9. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Bintang SDN 001 Bintang Timur Rp. 293.068.800,- sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 015 Bintang Timur Rp. 293.068.800,- belum terlaksana.



11. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 017 Bintang Timur Rp. 439.603.200,- Kegiatan sedang dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

12. Pembangunan Mini Zoo Kijang Kec. Bintan Timur Thp. II Rp. 600.000.000,- belum terlaksana.



13. Pembangunan Jalan Sidomulyo, KM 18 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (1,1 Km) Rp. 2.552.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

14. Normalisasi Aliran Drainase RT. 02/RW. 01 Kel.Sei Lekop Kec. Bintan Timur (1 Km)  
Rp. 500.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



15. Normalisasi Aliran Drainase RT. 01/RW. 02 Kel.Sei Lekop Kec. Bintan Timur (800 M)  
Rp. 400.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

16. Pembangunan Rumah Bersalin Puskesmas Sei. Lekop Kec. Bintan Timur (70 M2) Rp. 246.500.000,- sudah selesai dikerjakan.



17. Pembangunan Pagar Puskesmas Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (255 M') Rp. 310.000.000,- belum terlaksana.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

18. Pembangunan Batu Miring dan Pagar PAUD Cinta Nusantara RT. 04 RW. 01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur ( 114 M ) Rp. 190.000.000,- Kegiatan sudah selesai dikerjakan.



19. Pembangunan Lapangan bola dan sarana pendukung Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Rp. 1.700.000.000,- dalam tahap finishing pekerjaan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

20. Peningkatan dan Pelebaran Jalan dan Drainase Sp.Tugu Antam - Mini Zoo -Kolong Enam - Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (3 KM) Rp. 3.600.000.000,- belum terlaksana.



21. Pembangunan Masjid Fastabiqul Khairat Kampung Kolam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Rp. 400.000.000,-. Pekerjaan sedang dilaksanakan ,dalam tahap penyelesaian.





# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

22. Pembangunan Madrasah Kijang Kuning Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Rp. 1.000.000.000,- belum terlaksana.



23. Pembangunan Sarana Air Bersih Masjid At Taubah Gg. Nelayan RT.03 RW. 17 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Rp. 100.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

24. Pembangunan Gedung LAM Bintan Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Rp. 13.500.000.000,-dalam proses pekerjaan.



25. Pembangunan RSUD Kijang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Tahap - 4) Rp. 20.700.000.000,-kegiatan lanjutan ini sedang dalam pekerjaan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

26. Pembangunan Drainase RT. 02/RW. 03 Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur (700 M) Rp. 350.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



27. Pembangunan Drainase RT. 02, RT. 03/ RW. 01 Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur (550 M) Rp. 275.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

28. Peningkatan SPAM Kelurahan Sei Enam Kec. Bintang Timur (Accessories pipa, pipa HDPE, browncapting dan sambungan rumah murah) Rp. 220.000.000,- sudah selesai dikerjakan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV

## KECAMATAN TELUK BINTAN

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan serta upaya tindak lanjut atau langkah-langkah yang diambil untuk menempuh hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Paving Blok SD 005 Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan (672 M2) dengan Anggaran sebesar Rp.168.130.000,-



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

2. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (26.500 M') Lokasi Kecamatan Teluk Bintan dan Marka Parkir Kawasan Bebas Kendaraan (3000 M')



3. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Hibauan (100 bh) Lokasi di 6 Kecamatan (Kec. Bintan Timur, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Utara)



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

4. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 230 bh Lokasi di 6 Kecamatan (Kec. Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Utara)



5. Pengadaan dan Pemasangan Pita Penghaduh (300 M2) 6 Kecamatan (Kec. Bintan timur, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintan Utara)



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

6. Penyambungan Baru Lampu Stadion Teluk Bintang (Instalasi Gedung + KWH Meter 33.000 Watt) Realisasi Anggaran Kegiatan ini mencapai Rp125.000.000,00. Hasil pantauan tim di lapangan Instalasi gedung sudah ada tetapi KWH Meter belum terpasang, sehingga belum ada arus listrik.



7. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Single Ornament di Stadion Teluk Bintang Kec. Tlk. Bintang (4 buah) Anggaran kegiatan ini mencapai Rp100.000.000,00 Pantauan Tim di lapangan Pemasangan lampu Single Ornament sudah terpasang, tetapi belum dapat digunakan karena menunggu sambungan arus listrik.





## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

8. Peningkatan SPAM Desa Pengujan Kec. Teluk Bintang (menara air, Intake, sambungan rumah murah, pipa HDPE dan accessories pipa) Realisasi Anggaran kegiatan ini mencapai Rp 330.000.000,00 , Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Mata Air dengan nilai kontrak sebesar Rp. 293.438.427,65,-, dengan konsultan PT Teriang Sakti . Pantauan Tim Monitoring di lapangan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan



9. Pembangunan Pembuangan Sementara Sampah Terpadu 3R Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang. Anggaran yang di serap untuk kegiatan ni mencapai Rp 600.000.000,00, Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. AQJ Gemilang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 577.909.555,74, konsultan CV. Cipta Ganistama Konsultan, Hasil pantauan di lapangan kegiatan ini sedang berlangsung seperti pengecatan bangunan. Mesin mesin untuk pengolahan sampah sudah di dalam bangunan tetapi belum di setting.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

10. Rehabilitasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kel. Tembeling Tanjung Kec..... Teluk Bintan (1 Gedung) Dengan Realisasi Anggaran mencapai Rp237.000.000,00 Kegiatan ini sudah selesai dikerjakan.



11. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp. Tanah Merah Desa Penaga Kec. Teluk Bintan ( lanjutan ) ( 730 M ) Realisasi anggaran Kegiatan ini mencapai Rp 1.880.140.000,00. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Prima Karya Nusa dengan nilai kontrak Rp.1.861.782.226,45,- dengan konsultan CV. Vitech Pratama Consultant. Pantauan di lapangan pengaspalan dan pengerjaan batu miring / penahan tanah sudah diselesaikan.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

12. Pembangunan/Pengaspalan Jalan Kp. Banse Desa Penaga Kec. Teluk ..... Bintan (Lanjutan) (700 M) Dengan Realisasi anggaran mencapai Rp1.914.790.000,00 Pantauan Tim Monitoring di lapangan kegiatan ini masih dalam penyelesaian akhir pekerjaan.



13. Pembangunan Jembatan Kp. Banse Desa Penaga Kec. Teluk Bintan (30 M) Dengan Realisasi Anggaran Mencapai Rp 2.729.210.000,00, Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Multi Sindo International dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.609.438.811,99 dan konsultan PT.Vistatama Multi Engineering Consultant, Pantauan Tim Monitoring di lapangan pekerjaan masih berlangsung, walaupun jembatan sudah selesai, tetapi masih ada pengerjaan pengerasan dan pengaspalan antara jembatan ke jalan utama.



# LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

14. Pembangunan Paving Blok SD 005 Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintang ... (672 M2) Dengan Realisasi anggaran Rp 168.130.000,00 Kegiatan ini sudah selesai di laksanakan, sehingga dapat di gunakan untuk aktifitas pendidikan di SD 005 Desa Penaga.



15. Peningkatan SPAM Kp. Tanah Merah Desa Penaga Kec. Teluk Bintang ... (sambungan rumah murah, Accessories pipa, pipa HDPE dan sumur dangkal) Realisasi Kegiatan ini mencapai Rp 220.000.000,00 . Pantauan Tim Monitoring di lapangan kegiatan ini baru dalam proses penggalian untuk pemasangan pipa.



## LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN IV

16. Peningkatan SPAM Kp. Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang (Pipa HDPE, browncapting, accessories pipa dan sambungan rumah murah) Dengan Realisasi Anggaran mencapai Rp 440.000.000,00 Kegiatan ini sudah mencapai penggalian dan penimbunan pipa, selanjutnya penyambungan pipa dari rumah masyarakat ke pipa induk



17. Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang, Dengan Realisasi Anggaran Rp. 825.000.000,00. Kegiatan ini masih berlangsung pada pembuatan kolam control penampungan limbah dari rumah - rumah masyarakat.

